


AVIGNON
Ville d'exception

INEO
UNE MARQUE DE EQUANS

**GRAND
AVIGNON**

Rapport Annuel d'Activité n°12 2024



SOMMAIRE



Présentation du marché

•	Gestion	3
•	Exploitation.....	3
•	Renouvellement des installations.....	3

01 Etat du Patrimoine

1.1	Etat du Patrimoine	5
-	Puissance / Armoire.....	6
-	Répartition des sources.....	10
-	Nombre de foyers / Armoire/ % de reconstruction.....	11
-		

02 Activité

2.1	Économie d'énergie Poste G1	16
2.2	Maintenance (préventive, curative, synthèse & compte rendu exécution) Poste G2	22
2.3	Maintien du patrimoine (travaux & sinistres) Poste G3	35
2.4	Travaux préfinancés (travaux, sous-traitance PME, mise en lumières) Poste G4 .	45
2.5	Illuminations festives (décompte des travaux).....	72

03 Bilan

3.1	Bilan actif.....	76
3.2	Bilan passif.....	77
3.3	Compte de résultat de l'exercice.....	78
3.4	Certificat de calcul.....	80
3.5	Annexes 1.....	

04 Développement durable

4.1	Optimisation du poste de fonctionnement.....	84
4.2	Note sur la pollution lumineuse.....	84

PRÉSENTATION DU MARCHÉ


Gestion Exploitation Renouvellement des installations

Le présent marché est un contrat de Partenariat pour la (Re)construction avec financement, la gestion énergétique et la maintenance à garantie de résultats des installations d'éclairage public sur le territoire de la commune d'Avignon, dans sa composante énergétique, exploitation-maintenance, dépannage et reconstruction.

Ce marché a débuté le 1er janvier 2013, pour une durée de 15 ans, conclu entre la ville d'Avignon, du Grand Avignon et INEO.

INEO s'est engagée à offrir aux administrés la lumière qu'ils méritent et ce à plusieurs niveaux :

- Contribuer à la baisse de la facture énergétique.
- Garantir la continuité de service de l'éclairage Public.
- Dépanner les installations endommagées.
- Rénover pour rajeunir et améliorer le patrimoine de la ville dans un souci de performance, de sécurité, de pérennité, d'optimisation des ressources et d'esthétisme.



Présentation du marché

Poste G0

INEO assure la gestion du marché et dispose de l'ensemble des données technico-économiques qui permettent de garantir en toute transparence le suivi du contrat et cela pour l'ensemble des postes prévus au marché.

Le recensement des installations réalisé par INEO au début du marché permet de connaître à tout moment l'état des installations puisque les mises à jour de la base de données et cartographique associée sont réalisées en fonction des différentes opérations de maintenance ou de maintien du patrimoine.

- la responsabilité d'exploitant de l'ensemble du réseau
- la tenue et l'exploitation de la base de données
- les détections des dysfonctionnements et des non-conformités
- le rapport d'activité
- l'analyse et le conseil devant déboucher sur des propositions d'amélioration
- la communication et l'information du client,
- la gestion des DR/DICT



Poste Énergie G1

INEO assure le suivi, la vérification des mémoires du fournisseur d'énergie pour le fonctionnement du service, lequel comprend notamment la vérification de l'exactitude des consommations et la bonne adéquation des puissances souscrites suite aux travaux.

Le cas échéant, INEO propose des changements afin de faire baisser la facture énergétique

Poste Exploitation – Maintenance G2

L'entretien et la maintenance sont assurés par INEO qui intervient sur toute la ville d'Avignon. Les signalements pour dysfonctionnement de l'éclairage sont saisis informatiquement par la ville ou INEO et directement transmis sur les ordinateurs embarqués dans les camions élévateurs des techniciens, permettant ainsi d'optimiser les délais d'intervention. La ville peut, si elle le souhaite, consulter les dépannages via l'outil internet mis en place au début du contrat par qui administre la base de données.

Poste Dépannage G3

Le remplacement des installations accidentées ou vandalisées est assuré par INEO qui se doit d'intervenir dans un délai très court. INEO se charge de recouvrer la dépense lors des accidents avec tiers identifié et, le cas contraire, se charge du dépôt de plainte par subrogation de la ville.



Poste reconstruction G4

Le maintien du patrimoine vise plusieurs objectifs. En premier lieu, il convient de remplacer les matériels vétustes qui consomment trop d'énergie et offrent un éclairage faible (luminaires avec lampes de type « ballon fluo »). Il convient également d'assurer la mise en sécurité des armoires de commande présentant un risque pour les personnes ou les travailleurs. La mise en place d'horloges astronomiques permet également de garantir et maîtriser le temps d'allumage.



ÉTAT DU PATRIMOINE

Puissance/ Armoire

Répartition des sources

Nombre de foyers/Armoire



État du Patrimoine

Puissance installée par armoire de commande

N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023		N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023
1	10,362	0%	10,36		58	3,992	-29%	5,61
2	8,55	0%	8,55		59	1,236	0%	1,236
3	19,913	0%	19,91		60	5,405	-22%	6,965
4	3,79	-36%	5,90		61	4,989	0%	4,989
5	1,287	-52%	2,67		62	10,65	0%	10,65
6	2,876	-39%	4,72		63	6,336	5%	6,026
7	0,28	-71%	0,95		64	1,3	0%	1,3
8	11,958	-8%	13,00		65	6,717	-7%	7,193
9	9,88	2%	9,68		66	5,956	-1%	6,006
10	2,413	-47%	4,53		67	0,4	0%	0,4
11	1,996	-38%	3,22		68	5,58	0%	5,58
12	2,134	0%	2,13		69	6,18	0%	6,18
13	6,67	0%	6,67		70	5,881	-6%	6,28
14	1,809	0%	1,81		71	2,99	0%	2,99
15	8,279	0%	8,28		72	3,786	0%	3,786
16	2,63	0%	2,63		73	2,854	0%	2,854
17	1,924	-42%	3,31		74	1	0%	1
18	4,37	0%	4,37		75	3,758	0%	3,758
19	10,156	1%	10,01		76	2,43	0%	2,43
20	5,081	0%	5,08		77	2,642	-33%	3,93
21	1,752	-45%	3,21		78	3,095	-5%	3,263
22	4,31	0%	4,31		79	0,923	0%	0,923
23	28,959	1%	28,61		80	4,801	-16%	5,703
24	14,376	-1%	14,48		81	5,67	-10%	6,3
25	1,831	0%	1,83		82	2,132	-17%	2,564
26	7,213	-1%	7,29		83	7,06	-18%	8,622
27	9,574	0%	9,57		84	3,102	-8%	3,365
28	1,875	0%	1,88		85	4,104	-19%	5,06
29	3,658	-9%	4,00		86	3,94	0%	3,925
30	1,389	0%	1,39		87	3,48	0%	3,48
31	2,87	0%	2,87		88	3,063	-41%	5,185
32	10,106	-12%	11,42		89	4,584	-7%	4,926
34	4,23	-15%	5,00		90	8,061	-6%	8,581
35	7,341	-2%	7,52		91	2,776	0%	2,776
36	2,82	0%	2,82		93	5,305	0%	5,305
37	4,605	-8%	5,02		94	0,836	-61%	2,12
38	10,574	1%	10,50		95	6,106	-4%	6,36
39	13,752	-9%	15,13		96	7,832	-32%	11,6
40	1,05	0%	1,05		97	0,12	-60%	0,3
41	5,156	0%	5,16		98	0,9	0%	0,9
42	9,847	0%	9,85		99	4,612	-4%	4,78
43	0,874	0%	0,87		100	22,896	-1%	23,046
44	8,07	0%	8,07		101	1,292	0%	1,292
45	6,295	-2%	6,42		102	9,252	0%	9,252
46	1,96	0%	1,96		103	6,38	0%	6,38
47	6,454	0%	6,45		104	1,805	0%	1,805
48	16,832	0%	16,83		105	4,18	0%	4,18
49	2,348	0%	2,35		106	1,85	-5%	1,95
50	5,276	-4%	5,51		107	1,896	-61%	4,8
51	1,358	0%	1,36		108	5,5	0%	5,5
52	1,65	0%	1,65		109	16,365	-2%	16,668
53	3,1	-2%	3,16		110	3,917	0%	3,917
54	3,638	0%	3,64		111	4,81	-1%	4,86
55	2,415	0%	2,42		112	3,187	0%	3,187
56	3,826	0%	3,83		113	2,47	0%	2,47
57	7,92	0%	7,92		114	5,736	8%	5,311

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023		N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023
115	0,558	0%	0,56		172	8,4	0%	8,40
116	1,156	0%	1,16		173	15,397	-1%	15,54
117	5,368	-42%	9,29		175	2,05	-13%	2,35
118	11,91	0%	11,91		176	0,52	-63%	1,40
119	9,321	0%	9,32		177	13,882	-4%	14,52
120	3,296	0%	3,30		178	11,741	-16%	14,00
121	5,321	0%	5,32		179	5,872	-28%	8,18
122	7,45	-1%	7,50		180	8,983	-28%	12,46
123	8,302	-3%	8,60		181	5,196	-1%	5,24
124	5,94	0%	5,94		182	1,78	-10%	1,98
125	6,066	-14%	7,04		183	13,384	-19%	16,56
126	2,98	-4%	3,10		184	12,626	-6%	13,49
127	1,25	-36%	1,95		185	19,375	0%	19,38
128	2,828	-36%	4,42		186	1,818	0%	1,82
129	3,05	-6%	3,23		187	2,118	-48%	4,07
130	5,398	-17%	6,48		188	5,58	-32%	8,22
131	4,885	0%	4,89		189	2,399	-32%	3,55
132	12,103	0%	12,10		190	19,1	0%	19,17
133	3,342	0%	3,34		191	2,975	0%	2,98
134	3,585	-46%	6,69		192	4,43	-15%	5,20
135	0,288	-61%	0,74		193	2,052	-42%	3,53
136	5,186	-23%	6,75		194	3,004	-39%	4,95
137	3,433	-21%	4,33		195	2,466	0%	2,47
138	3,236	-27%	4,46		196	3,84	0%	3,84
139	2,329	2%	2,28		197	1,874	-61%	4,83
140	7,81	-1%	7,87		198	0,84	0%	0,84
141	0,96	-60%	2,40		199	2,05	0%	2,05
142	4,21	0%	4,21		200	7,119	-1%	7,22
143	1,222	-60%	3,05		201	3,881	-27%	5,35
144	1,54	-40%	2,56		202	4,5	0%	4,50
145	8,29	0%	8,29		203	15,554	-1%	15,65
146	0,73	-52%	1,51		204	12,825	1%	12,75
147	3,818	36%	2,80		205	14,418	-6%	15,39
148	4,21	-40%	7,00		206	3,414	-13%	3,93
149	3,46	-7%	3,72		207	2,432	-11%	2,73
150	3,574	0%	3,57		208	3,556	-19%	4,39
151	5,618	0%	5,62		209	1,314	0%	1,31
152	7,68	-4%	7,98		210	13,55	-3%	13,92
153	2,2	0%	2,20		211	6,714	-24%	8,87
154	5,258	-11%	5,93		212	6,5	0%	6,50
155	2,16	-45%	3,90		213	0,68	-60%	1,70
156	0,36	-60%	0,90		214	0,76	-58%	1,80
157	9,75	0%	9,75		215	3,92	-11%	4,40
158	0,75	0%	0,75		216	3,663	-23%	4,73
159	5,76	0%	5,76		217	3,175	0%	3,18
160	7,71	0%	7,71		218	7,794	-6%	8,26
161	5,39	0%	5,39		219	4,022	0%	4,02
162	2,951	-16%	3,50		220	1,604	-10%	1,78
163	3,662	-9%	4,01		221	4,838	0%	4,84
164	5,052	0%	5,05		222	7,398	0%	7,40
165	2,356	0%	2,36		223	8,598	0%	8,60
166	0,4	0%	0,40		224	3,604	0%	3,60
167	1,752	-60%	4,33		225	2,84	0%	2,84
168	4,949	-11%	5,55		226	5,833	-9%	6,42
169	3,38	0%	3,38		227	3,686	-9%	4,04
170	2,814	-29%	3,95		228	3,481	3%	3,38
171	0,5	0%	0,50		229	5,692	0%	5,69

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023		N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023
230	4,276	0%	4,28		286	7,895	3%	7,70
231	1,586	-12%	1,80		287	6,88	0%	6,88
232	4,545	0%	4,55		288	2,952	0%	2,95
233	2,99	0%	2,99		289	2,062	-57%	4,82
234	6,8	0%	6,80		290	6,845	0%	6,88
235	1,93	0%	1,93		291	3,771	-7%	4,07
236	1,1	0%	1,10		292	3,554	-17%	4,26
237	3,25	0%	3,25		293	4,422	-15%	5,20
238	5,46	-29%	7,65		294	2,36	-46%	4,40
239	11,13	-19%	13,70		295	9,198	6%	8,71
240	9,525	0%	9,53		296	0,682	-56%	1,55
241	1,4	0%	1,40		297	4,465	-21%	5,65
242	6,17	0%	6,17		298	3,615	0%	3,62
243	12,97	0%	13,02		299	2,82	0%	2,82
244	3,29	0%	3,29		300	3,5	0%	3,50
245	0,6	0%	0,60		301	3,43	0%	3,43
246	5,502	0%	5,50		302	20,233	0%	20,23
247	7,43	0%	7,43		303	2,642	0%	2,64
248	2,55	0%	2,55		304	1,938	0%	1,94
249	7,656	0%	7,66		305	5,046	0%	5,05
250	9,95	-10%	11,00		306	5,368	0%	5,37
251	21,3	0%	21,28		307	3,388	-23%	4,43
252	5,22	0%	5,22		308	6,25	1%	6,20
253	7,35	-20%	9,20		309	1,912	0%	1,91
254	6,51	-11%	7,35		310	1,9	0%	1,90
255	6,825	5%	6,48		311	1,12	0%	1,12
256	8,55	0%	8,55		312	2,7	0%	2,70
257	3,79	0%	3,79		313	4,026	-1%	4,05
258	10,1	0%	10,10		314	6,95	0%	6,95
259	2,19	0%	2,19		315	0,7	0%	0,70
260	3,814	-26%	5,15		317	0,099	0%	0,10
261	1,35	0%	1,35		319	0,98	0%	0,98
262	1,2	-17%	1,45		320	4,658	2%	4,57
263	6,57	0%	6,57		321	9,895	0%	9,90
264	5,15	-4%	5,35		322	0,456	0%	0,46
265	2,84	4%	2,74		323	6,12	-11%	6,85
266	1,34	0%	1,34		324	5,042	0%	5,04
267	5,652	-16%	6,72		325	2,865	0%	2,87
268	2,775	0%	2,78		326	2,95	5%	2,80
269	3,35	-1%	3,40		327	4,1	1%	4,06
270	7,9	-1%	8,00		328	0,624	-61%	1,58
271	1,3	0%	1,30		329	4,002	-5%	4,23
272	4,35	0%	4,35		330	4,6	0%	4,60
273	12,695	0%	12,70		332	1,32	0%	1,32
274	4,92	3%	4,77		333	5,82	-10%	6,45
275	1,802	-31%	2,60		334	1,82	0%	1,82
276	10,01	0%	10,01		335	3,3	0%	3,30
277	4,215	0%	4,22		336	1,518	0%	1,52
278	15,22	-6%	16,24		337	8,75	0%	8,75
279	2,1	0%	2,10		338	2,3	0%	2,30
280	6	0%	6,00		339	0,9	0%	0,90
281	5,1	0%	5,10		340	21,9	0%	21,90
282	9,455	0%	9,44		341	12,55	0%	12,55
283	1,8	0%	1,80		342	4,4	0%	4,40
284	2,52	0%	2,52		343	3,75	0%	3,75
285	16,785	0%	16,79		344	4,102	0%	4,10

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023		N° Armoire de commande	Puissance en KW 2024	Variation	Puissance en KW 2023
345	3,684	0%	3,68		909 (poste 28)	2,35	0%	2,35
346	1,2	0%	1,20		365	4,573	0%	4,57
347	1,786	0%	1,79		366	2,589	0%	2,59
348	10,6	0%	10,60		367	4,586	0%	4,59
349	14,002	0%	14,00		368	1,637	0%	1,64
350	4,436	0%	4,44		369	2,025	0%	2,03
351	1,26	0%	1,26		370	3,752	0%	3,75
352	14,968	-9%	16,50		371	3,326	0%	3,33
353	7,265	0%	7,27		372	0,6	0%	0
354	4,31	0%	4,31		Solaire			0
355	2,325	0%	2,33					
356	18,515	0%	18,57					
357	6,3	0%	6,30					
358	4,458	-3%	4,59					
359	5,248	-50%	10,42					
360	4,096	-20%	5,10					
361	7,17	0%	7,17					
362	0,945	28%	0,74					
363	0,78	0%	0,78					
364	9,85	3%	9,55					
800	0,364	-63%	0,98					
901	2,049	-31%	2,98					

Puissance moyenne installée par armoire : 5,08 kW au 31/12/2024

Puissance moyenne installée par armoire : 5,47 kW au 31/12/2023

Puissance moyenne installée par armoire : 5,92 kW au 31/12/2022

Puissance moyenne installée par armoire : 6,10 kW au 31/12/2021


Puissance moyenne installée par armoire : 6,16 kW au 31/12/2020

Puissance moyenne installée par armoire : 6,22kW au 31/12/2019


Les travaux réalisés dans le cadre des investissements différés et GER 2024 ont permis une baisse de **7 %** des puissances installées.

État du Patrimoine

Répartition des sources par types 2024

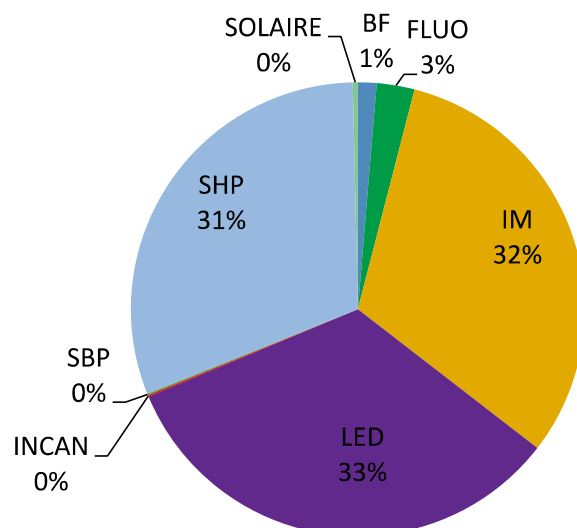

Répartition des sources par types 2023

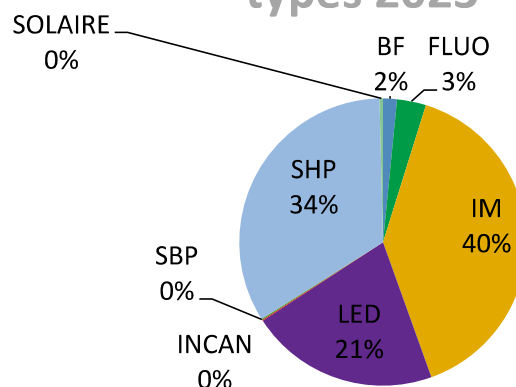

En 2024 dans le cadre du contrat nous avons remplacé 2490 sources conventionnelles par des sources de technologie LED

État du Patrimoine

Répartition de foyers par amoire de commande

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)		N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
1	82	42,68%		59	22	81,82%
2	87	63,22%		60	63	41,27%
3	161	35,40%		61	52	90,38%
4	92	81,52%		62	43	4,65%
5	63	0,00%		63	98	94,90%
6	46	65,22%		64	12	16,67%
7	7	100,00%		65	85	81,18%
8	115	53,91%		66	83	73,49%
9	75	14,67%		67	10	100,00%
10	64	100,00%		68	54	77,78%
11	31	90,32%		69	51	100,00%
12	33	69,70%		70	88	87,50%
13	43	13,95%		71	37	59,46%
14	43	88,37%		72	39	100,00%
15	86	87,21%		73	37	91,89%
16	41	97,56%		74	13	100,00%
17	36	100,00%		75	84	91,67%
18	64	98,44%		76	30	100,00%
19	99	28,28%		77	65	100,00%
20	67	80,60%		78	41	87,80%
21	64	100,00%		79	12	50,00%
22	152	91,45%		80	108	23,15%
23	213	18,31%		81	75	30,67%
24	107	21,50%		82	52	100,00%
25	44	93,18%		83	109	85,32%
26	95	63,16%		84	43	95,35%
27	96	96,88%		85	46	82,61%
28	8	0,00%		86	38	97,37%
29	90	88,89%		87	37	100,00%
30	19	21,05%		88	62	100,00%
31	31	100,00%		89	57	68,42%
32	102	56,86%		90	89	100,00%
34	97	85,57%		91	59	84,75%
35	111	76,58%		93	63	1,59%
36	72	100,00%		94	23	100,00%
37	65	78,46%		95	52	53,85%
38	143	70,63%		96	84	67,86%
39	234	1,71%		97	3	100,00%
40	7	100,00%		98	6	0,00%
41	88	86,36%		99	35	31,43%
42	261	0,00%		100	127	26,77%
43	23	100,00%		101	34	100,00%
44	72	100,00%		102	83	95,18%
45	118	76,27%		103	50	82,00%
46	28	100,00%		104	17	35,29%
47	97	87,63%		105	72	86,11%
48	89	10,11%		106	13	0,00%
49	51	100,00%		107	22	100,00%
50	81	67,90%		108	46	45,65%
51	23	100,00%		109	145	24,14%
52	11	100,00%		110	51	76,47%
53	38	97,37%		111	41	41,46%
54	39	100,00%		112	32	100,00%
55	68	100,00%		113	31	100,00%
56	39	5,13%		114	55	20,00%
57	71	33,80%		115	12	75,00%
58	57	96,49%		116	15	100,00%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)		N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
117	86	96,51%		175	18	66,67%
118	101	71,29%		176	20	100,00%
119	82	97,56%		177	82	20,73%
120	30	43,33%		178	98	40,82%
121	99	94,95%		179	82	84,15%
122	57	17,54%		180	148	88,51%
123	109	75,23%		181	40	25,00%
124	57	21,05%		182	16	100,00%
125	56	39,29%		183	75	62,67%
126	20	75,00%		184	70	27,14%
127	21	100,00%		185	95	0,00%
128	41	100,00%		186	20	60,00%
129	27	100,00%		187	31	100,00%
130	64	35,94%		188	88	97,73%
131	38	0,00%		189	32	100,00%
132	59	100,00%		190	215	80,93%
133	83	100,00%		191	26	3,85%
134	64	93,75%		192	51	94,12%
135	10	100,00%		193	36	88,89%
136	50	90,00%		194	42	100,00%
137	46	76,09%		195	48	72,92%
138	52	98,08%		196	43	97,67%
139	25	16,00%		197	50	100,00%
140	64	89,06%		198	12	100,00%
141	24	100,00%		199	24	100,00%
142	42	100,00%		200	77	94,81%
143	33	100,00%		201	61	90,16%
144	34	97,06%		202	30	0,00%
145	85	98,82%		203	152	57,24%
146	16	100,00%		204	181	87,29%
147	111	70,27%		205	124	72,58%
148	63	93,65%		206	42	92,86%
149	48	95,83%		207	29	24,14%
150	44	88,64%		208	34	85,29%
151	90	98,89%		209	25	84,00%
152	59	18,64%		210	88	80,68%
153	10	20,00%		211	84	48,81%
154	54	100,00%		212	58	98,28%
155	36	100,00%		213	17	100,00%
156	9	100,00%		214	19	100,00%
157	50	34,00%		215	43	23,26%
158	5	100,00%		216	51	56,86%
159	84	35,71%		217	30	16,67%
160	80	100,00%		218	72	58,33%
161	55	100,00%		219	33	72,73%
162	32	34,38%		220	14	71,43%
163	58	74,14%		221	65	98,46%
164	56	94,64%		222	62	40,32%
165	62	100,00%		223	54	22,22%
166	3	0,00%		224	34	14,71%
167	44	100,00%		225	18	0,00%
168	72	88,89%		226	41	95,12%
169	23	65,22%		227	53	98,11%
170	49	71,43%		228	56	0,00%
171	5	100,00%		229	46	97,83%
172	52	0,00%		230	49	100,00%
173	119	36,97%		231	28	85,71%
				232	38	55,26%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)		N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
233	32	100,00%		291	107	100,00%
234	50	86,00%		292	53	66,04%
235	22	90,91%		293	56	78,57%
236	13	76,92%		294	44	100,00%
237	29	75,86%		295	51	49,02%
238	66	100,00%		296	17	100,00%
239	88	97,73%		297	59	59,32%
240	71	56,34%		298	45	37,78%
241	14	100,00%		299	30	100,00%
242	56	78,57%		300	45	100,00%
243	100	62,00%		301	45	75,56%
244	26	57,69%		302	88	17,05%
245	6	100,00%		303	43	100,00%
246	65	100,00%		304	30	100,00%
247	66	57,58%		305	73	100,00%
248	21	57,14%		306	60	100,00%
249	89	70,79%		307	53	100,00%
250	44	13,64%		308	67	74,63%
251	95	2,11%		309	47	100,00%
252	64	95,31%		310	19	100,00%
253	97	93,81%		311	13	92,31%
254	50	64,00%		312	37	100,00%
255	50	84,00%		313	43	55,81%
256	58	98,28%		314	38	13,16%
257	29	100,00%		315	7	0,00%
258	42	9,52%		317	3	0,00%
259	41	100,00%		319	14	100,00%
260	47	100,00%		320	54	100,00%
261	9	100,00%		321	84	82,14%
262	12	91,67%		322	12	100,00%
263	58	62,07%		323	46	100,00%
264	42	100,00%		324	45	91,11%
265	35	88,57%		325	37	91,89%
266	18	100,00%		326	25	72,00%
267	80	100,00%		327	55	100,00%
268	28	0,00%		328	24	100,00%
269	25	100,00%		329	36	52,78%
270	66	100,00%		330	36	0,00%
271	9	100,00%		332	22	100,00%
272	29	72,41%		333	36	5,56%
273	115	89,57%		334	18	61,11%
274	45	100,00%		335	33	0,00%
275	27	100,00%		336	44	9,09%
276	97	90,72%		337	37	0,00%
277	38	68,42%		338	23	0,00%
278	124	37,10%		339	6	0,00%
279	21	61,90%		340	147	0,68%
280	42	92,86%		341	83	0,00%
281	51	74,51%		342	32	15,63%
282	96	84,38%		343	25	4,00%
283	18	0,00%		344	53	54,72%
284	27	100,00%		345	38	47,37%
285	93	39,78%		346	11	0,00%
286	68	51,47%		347	47	61,70%
287	64	56,25%		348	76	0,00%
288	32	100,00%		349	105	8,57%
289	56	98,21%		350	98	48,98%
290	69	95,65%		351	18	5,56%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)		N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
352	80	0,00%		800	14	0,00%
353	105	20,00%		901	34	0,00%
354	33	21,21%		909	22	0,00%
355	25	0,00%		365	121	0,00%
356	174	3,45%		366	66	0,00%
357	42	0,00%		367	86	0,00%
358	24	70,83%		368	39	0,00%
359	87	39,08%		369	48	0,00%
360	52	0,00%		370	50	0,00%
361	51	0,00%		371	93	0,00%
362	30	46,67%		372	6	0,00%
363	8	0,00%		MAJ	59	0,00%
364	47	0,00%		SOLAIRE	73	0,00%

Année 2024

Nombre total de foyers	20450
Moyenne de foyers par armoires de commande	55
Pourcentage de rénovation	67,03%

Objectif de fin de contrat 74%

Année 2023 :

Nombre total de foyers	20255
Moyenne de foyers par armoires de commande	54
Pourcentage de rénovation	66,39%



ACTIVITÉ
Économie d'énergie
Maintenance
Maintien du patrimoine
Travaux préfinancés
Illuminations festives



ACTIVITÉ
Économie d'énergie
POSTE G1

2.1 POSTE G1

L'engagement contractuel de réduction des consommations électriques.

Bilan global (MWh)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
engagement de conso. (MWh)	13 678	12 396	11 383	10 381	10 246	10 111	9 977	9 843	9 709	9 576	9 444	9 311	9 180
économie correspondante		-9,37%	-16,78%	-24,10%	-25,09%	-26,08%	-27,06%	-28,04%	-29,02%	-29,99%	-30,96%	-31,92%	-32,89%
économie correspondante (MWh)		-1 282	-2 295	-3 297	-3 432	-3 567	-3 701	-3 835	-3 969	-4 102	-4 235	-4 367	-4 498
conso. réalisée (MWh)	13 678	12 495	11 312	10 093	9 547	9 234	8 620	8 293	7 955	8 158	7 998	7 524	6 373
économie réelle /référence		-8,65%	-17,30%	-26,21%	-30,20%	-32,49%	-36,98%	-39,37%	-41,84%	-40,36%	-41,53%	-44,99%	-53,41%
Ecart réalisé - référence (MWh)		-1 183	-2 366	-3 585	-4 131	-4 444	-5 058	-4 103	-3 428	-2 223	-2 383	-2 722	-3 738
écart réalisé - contrat (MWh)		99	-71	-288	-699	-877	-1 357	-1 550	-1 754	-1 419	-1 446	-1 787	-2 807

Comme prévu initialement, la baisse de consommation s'atténue légèrement à partir de l'année 2015 après une forte diminution au démarrage du contrat, due aux travaux.


Le rythme de la baisse se maintient depuis, en particulier grâce aux actions d'exploitation (modulation de puissance, réglage affiné des horloges), si ce n'est un « plateau » entre 2020 et 2022.

Depuis 2023 nous constatons une forte diminution de la consommation.

- **15%** entre 2023 et 2024, dû aux actions mises en place par la ville, reprogrammation des horloges astronomique, remplacement des lampes à décharge par des lampes LED, et mise hors tension de certains point lumineux dans certaines zones jugés sur éclairées .

ACTIVITÉ
Économie d'énergie
POSTE G1

POSTE G1

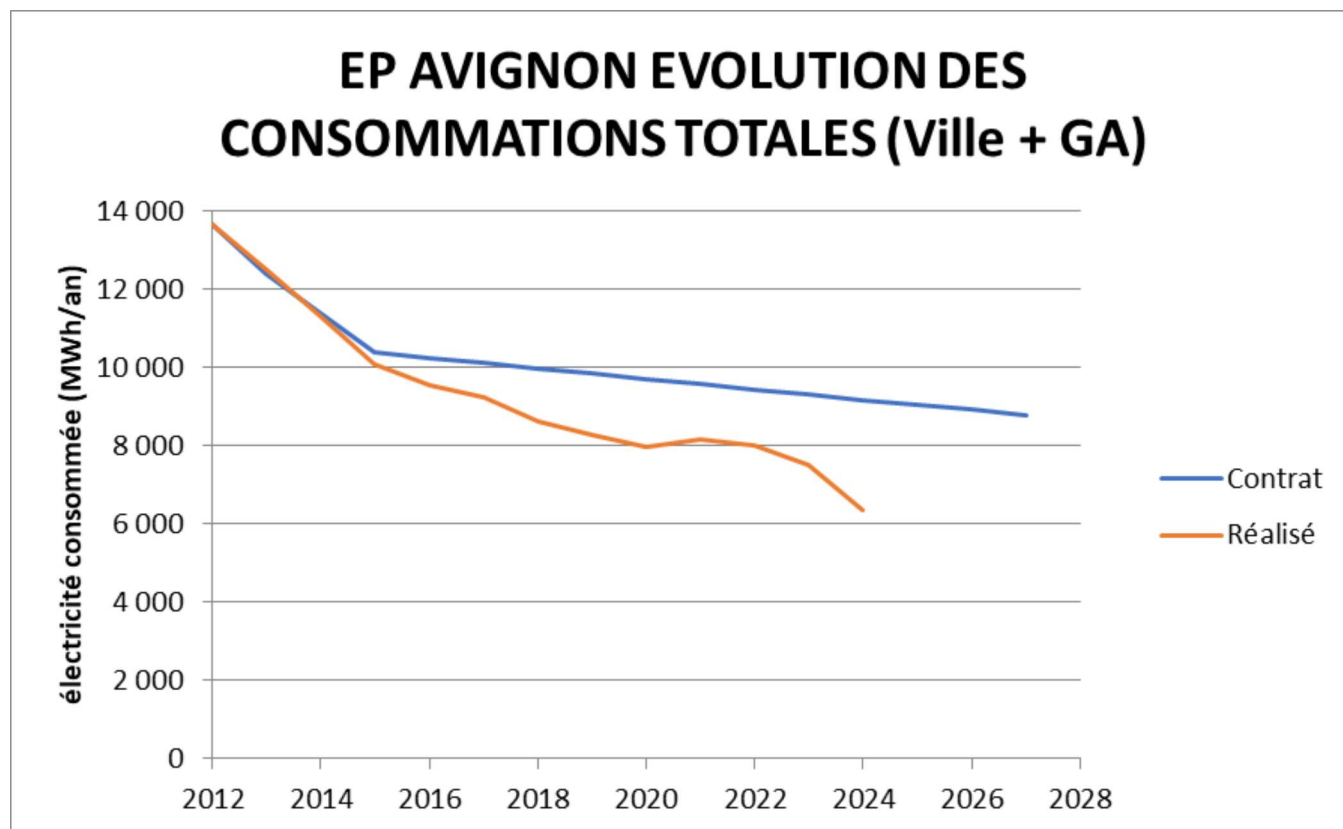

La consommation constatée sur 2024 est 30% plus faible que la consommation garantie.

Au vu des actions entreprises par les collectivités hors périmètre du contrat de partenariat, qui permettent une baisse des consommations significative.

Aucune bonification ne sera demandée pour l'exercice de 2024.

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

**La consommation constatée sur 2023 est 19 % plus faible
que la consommation garantie.**

Au vu des actions entreprises par les collectivités hors périmètre du
contrat de partenariat, qui permettent une baisse des consommations
significative.

Aucune bonification ne sera demandée pour l'exercice de 2023.

**La consommation constatée sur 2022 est 15,3 % plus faible que la
consommation garantie.**

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2022 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 446 MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie (facture Juin 2022) = 128,55 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2022 =
22,5 + 3,3150 + 6,63 = 32,445 €HT/MWh

$$B_{2021} = 1\,446 \times (128,55 + 32,445) / 2 = \underline{\underline{116\,399 \text{ Euros } \text{€HT}}}$$

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2021 pour est 14,08 % plus faible
que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2021 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 418 MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie (facture Avril 2022) = 128,55 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2022 =
 $22,5 + 3,3150 + 6,63 = 32,445$ €HT/MWh

$$B_{2021} = 1\,418 \times (128,55 + 32,445) / 2 = * 114\,141 \text{ Euros } \text{€HT}$$

Cet intéressement devra être recalculé à partir du prix moyen du MWh en 2021 à fournir SVP

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2020 pour est 18,06 % plus faible
que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2020 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 754 MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2020 = 68,10 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2020 =
22,5 + 3,2725 + 6,545 = 32,3175 €HT/MWh

$$B_{2018} = 1\,754 \times (68,10 + 32,3175) / 2 = 87\,941,17 \text{ €HT}$$

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2019 est 15,7 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2019 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 550 MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2019 = 67,80 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2019 = 22,5 + 3,23 + 6,46 = 32,19 €HT/MWh

$$B_{2019} = 1\,550 \times (67,80 + 32,19) / 2 = 77\,492,25 \text{ €HT}$$

La consommation constatée sur 2018 pour est 11,1 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2018 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 250MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2018 = 63,10 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2018 = 22,5 + 3,19 + 6,38 = 32,07 €HT/MWh

$$B_{2018} = 1\,250 \times (63,1 + 32,07) / 2 = 59\,481.25 \text{ €HT}$$

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2017 est 8,7 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2017 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 877MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 15 juillet 2017 = 61,9 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2017
= 22,5 + 3,19 + 6,38 = 32,07 €HT/MWh

$$B_{2017} = 877 \times (61,9 + 32,07) / 2 = 41\,205 \text{ €HT}$$

La consommation constatée sur 2016 est 6,8 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2016 :

$$B = (E0 - ER) \times (C0 + T) / 2$$

$E0 - ER$ = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 699,13 MWh.

$C0$ = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 15 juillet 2016 = 57,3 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2016 =
22,5 + 3,19 + 6,38 = 32,07 €HT/MWh

$$B_{2016} = 699,13 \times (57,3 + 32,07) / 2 = 31\,240,62 \text{ €HT}$$

ACTIVITÉ Maintenance POSTE G2


2.2 Maintenance curative



Demandes d'intervention reçues pendant les heures ouvrables 2024

janvier	98
février	53
mars	67
avril	61
mai	53
juin	49
juillet	44
août	32
septembre	94
octobre	102
novembre	92
décembre	68


Total 2024: 813

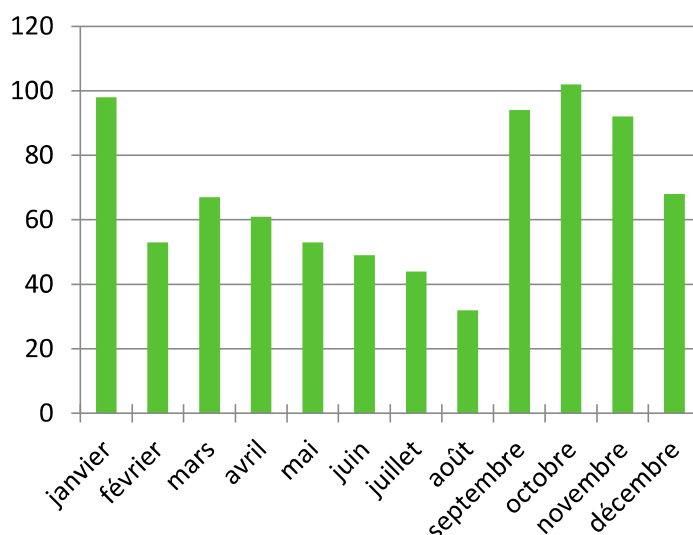

Demandes d'intervention reçues pendant les heures ouvrables 2023



janvier	89
février	63
mars	64
avril	49
mai	42
juin	39
juillet	32
août	28
septembre	96
octobre	111
novembre	119
décembre	105

Total 2023: 837

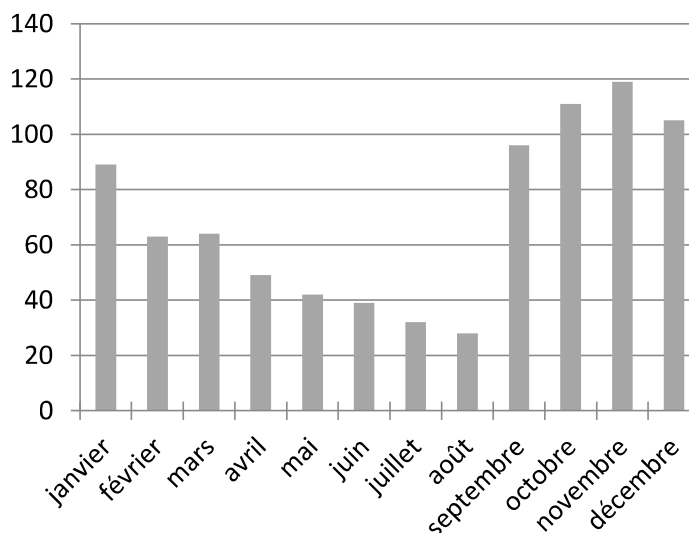

Soit: -2,8% de demandes d'intervention

Analyse du traitement de la maintenance curative

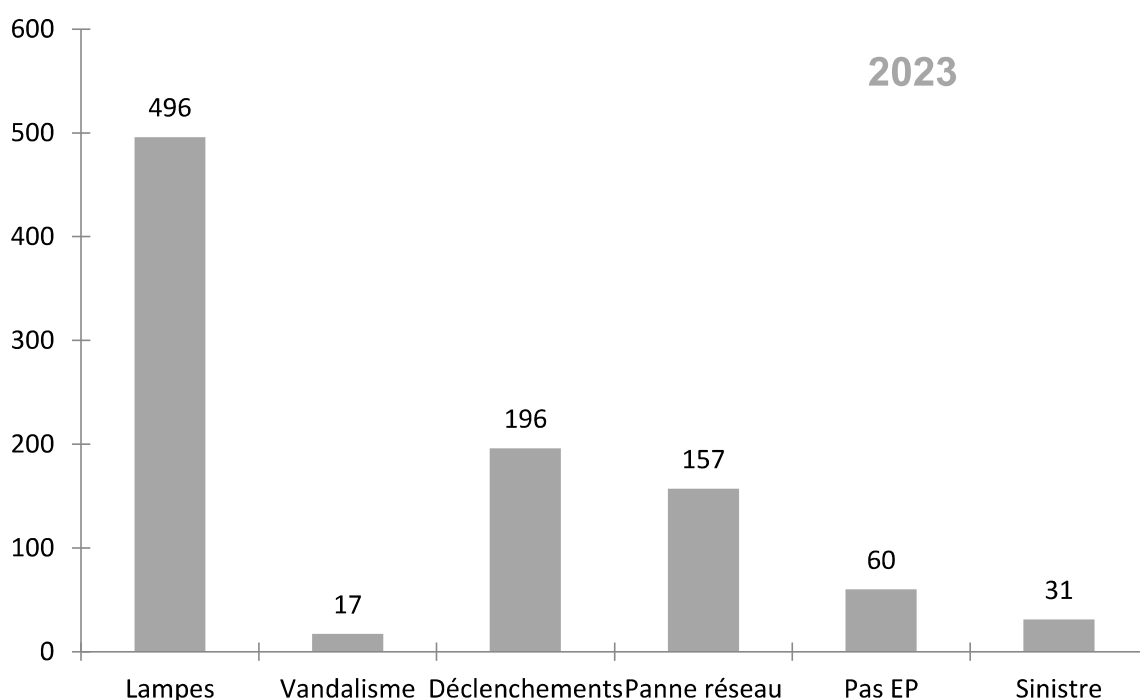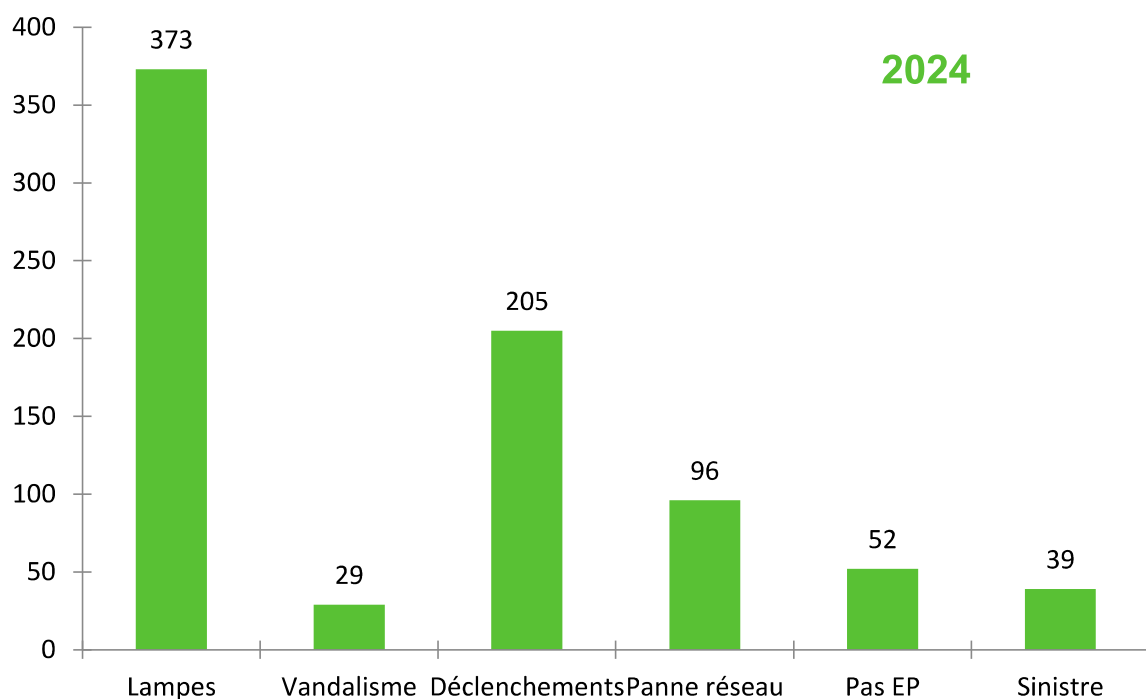

Vandalisme : portes arrachées, boules cassées, câbles coupés, vitres brisées


Déclenchements : fusibles, déclenchement disjoncteur divisionnaire et général, fusibles EDF,
Panne réseau : Horloges restant enclenchées, reprise programmation horloges, recherche de panne

Sinistres: dépose de supports et luminaires divers

Analyse du traitement de la maintenance curative




2024

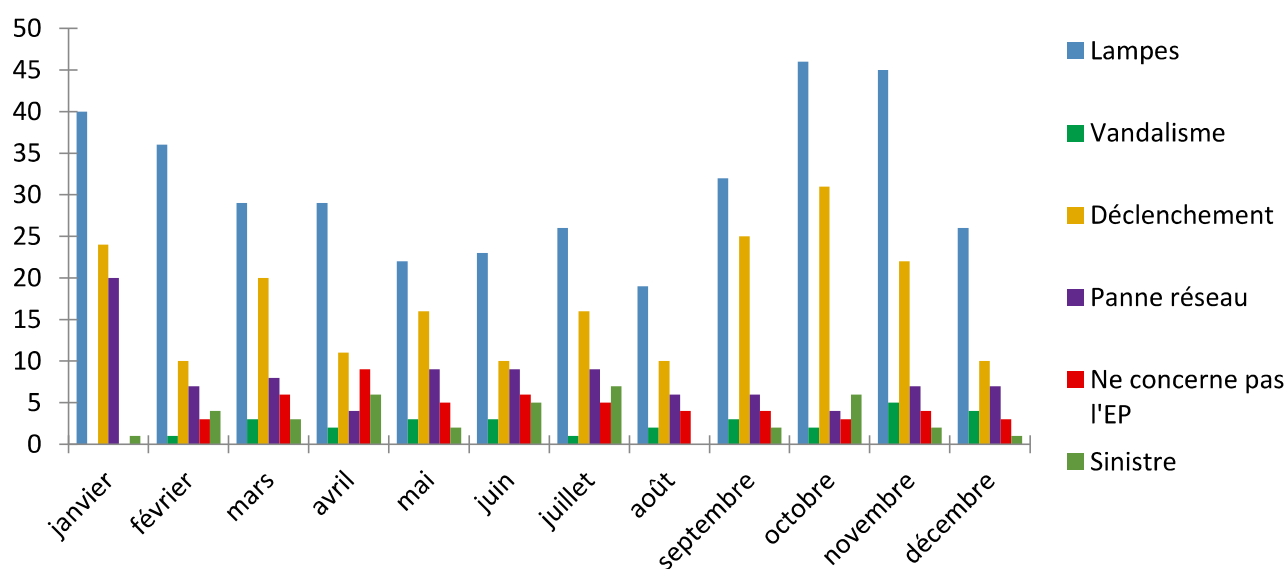


ACTIVITÉ Maintenance POSTE G2



Demandes d'intervention reçues par le service d'astreinte hors heures ouvrables 2023

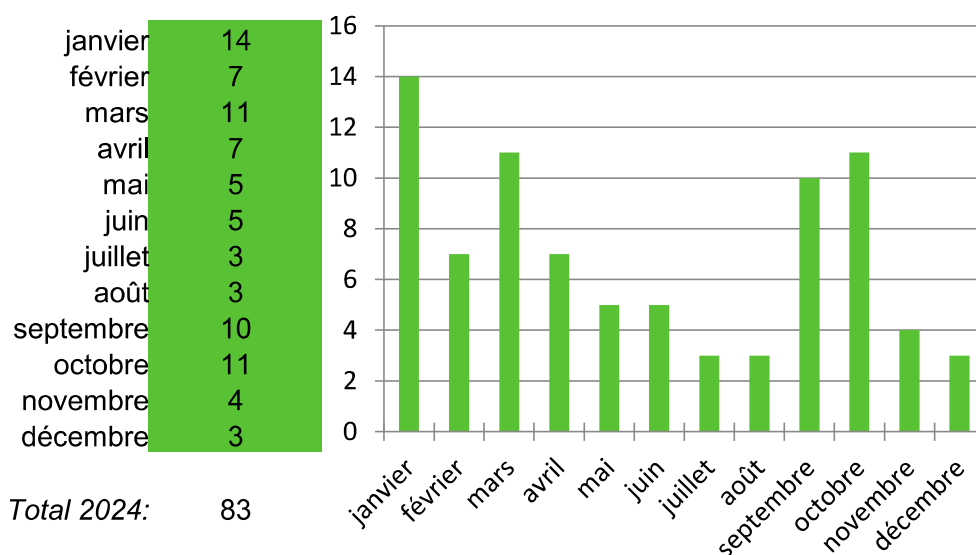


Demandes d'intervention reçues par le service d'astreinte hors heures ouvrables 2022

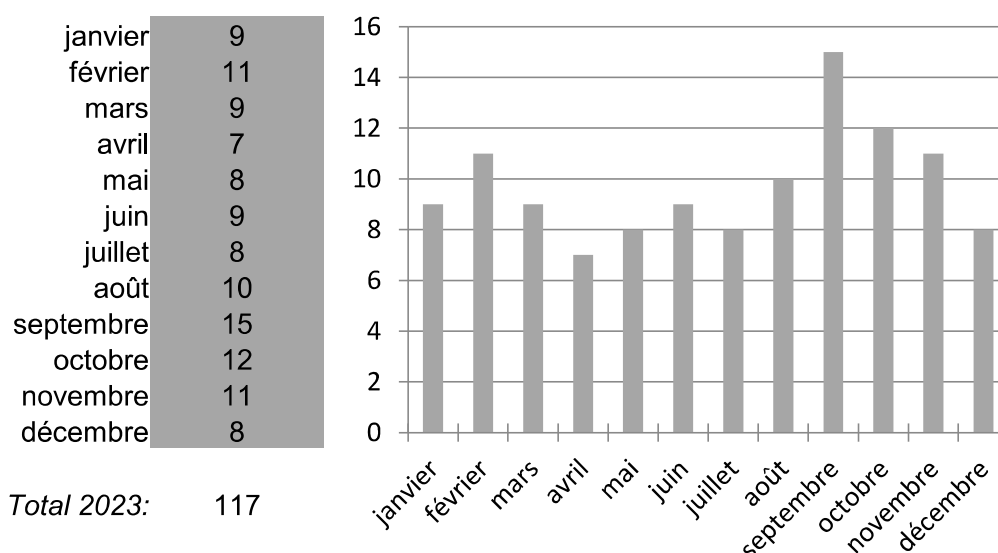

Soit: -29% de demandes d'intervention d'astreinte

Rapport d'activité du service
d'astreinte

En 2024 75% des interventions d'astreinte sont
générées par des déclenchements d'armoire

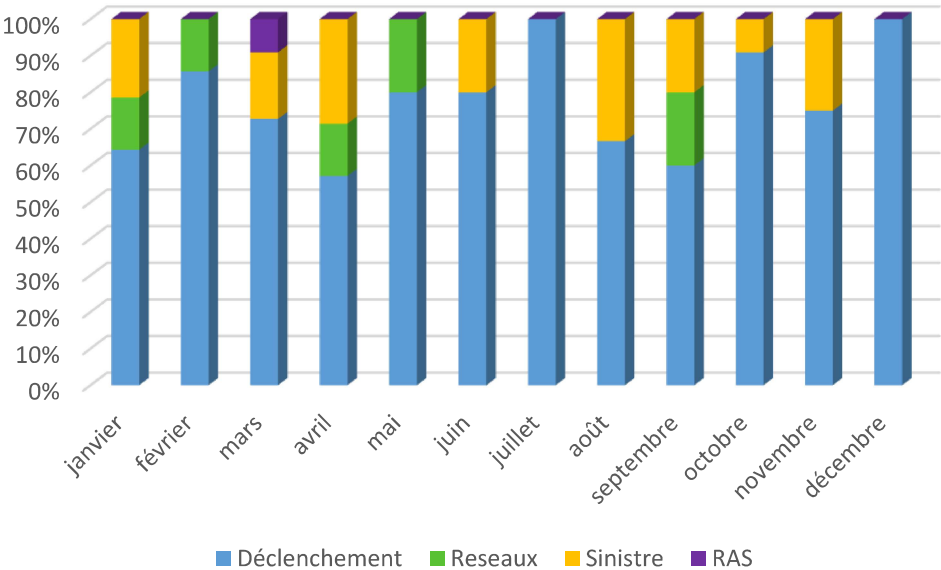


Astreinte 2024					
	Déclenchement	Reseaux	Sinistre	RAS	Total
janvier	9	2	3	0	14
février	6	1	0	0	7
mars	8	0	2	1	11
avril	4	1	2	0	7
mai	4	1	0	0	5
juin	4	0	1	0	5
juillet	3	0	0	0	3
août	2	0	1	0	3
septembre	6	2	2	0	10
octobre	10	0	1	0	11
novembre	3	0	1	0	4
décembre	3	0	0	0	3
TOTAL :	62	7	13	1	83

	Déclenchement	Reseaux	Sinistre	RAS
Repartition en %	75%	8%	16%	1%

Rapport de service

ACTIVITÉ
Maintenance
POSTE G2

En 2024 45% des dépannages ont été réalisés suite à une demande de la collectivité et 55% par détection des équipes INEO

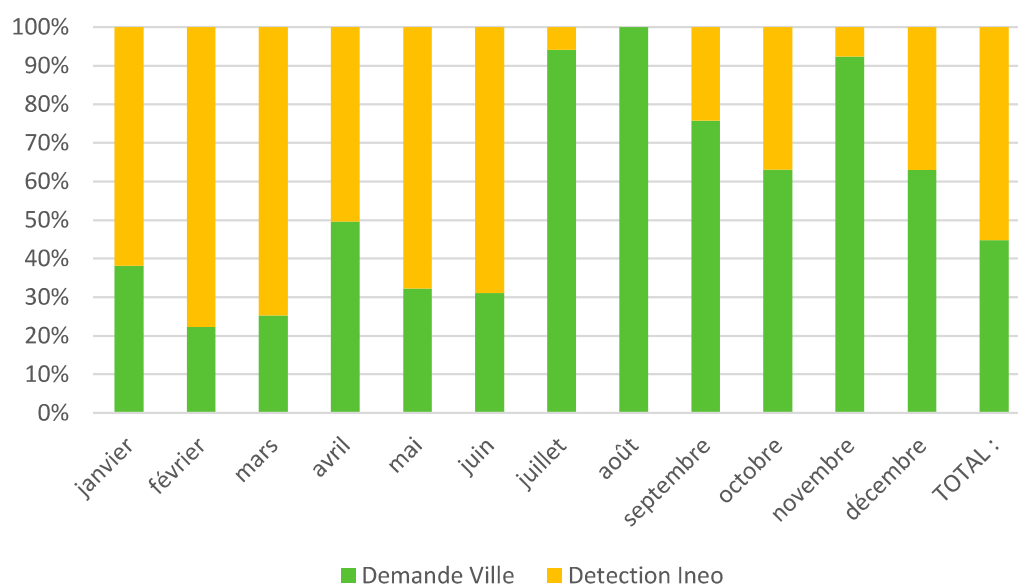

Cause intervention 2024			
	Demande Ville	Detection Ineo	Total
janvier	85	138	223
février	61	212	273
mars	69	204	273
avril	61	62	123
mai	57	120	177
juin	56	124	180
juillet	64	4	68
août	41	0	41
septembre	72	23	95
octobre	92	54	146
novembre	85	7	92
décembre	51	30	81
TOTAL :	794	978	1772



	Demande Ville	Detection Ineo
Répartition en %	45%	55%

ACTIVITÉ Maintenance POSTE G2

Détails des interventions AVIGNON / GRAND AVIGNON



	Lampes	Vandalisme	Déclenchement	Panne réseau	Ne concerne pas l'EP	Sinistre	Total
janvier	40	0	24	20		1	85
février	36	1	10	7	3	4	61
mars	29	3	20	8	6	3	69
avril	29	2	11	4	9	6	61
mai	22	3	16	9	5	2	57
juin	23	3	10	9	6	5	56
juillet	26	1	16	9	5	7	64
août	19	2	10	6	4	0	41
septembre	32	3	25	6	4	2	72
octobre	46	2	31	4	3	6	92
novembre	45	5	22	7	4	2	85
décembre	26	4	10	7	3	1	51
Total:	373	29	205	96	52	39	794

Analyse des délais d' interventions sur appels (de jour)

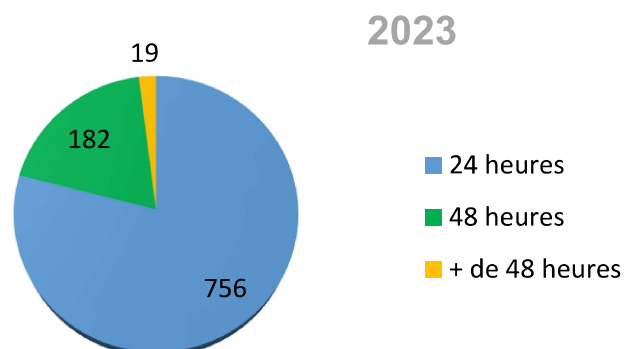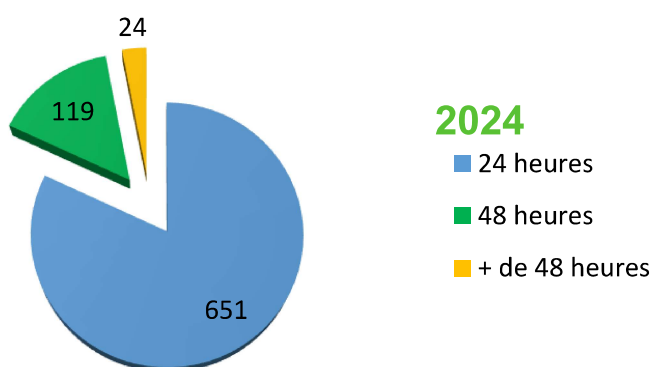


Analyse Vandalisme tous quartiers

ACTIVITÉ
Maintenance
POSTE G2

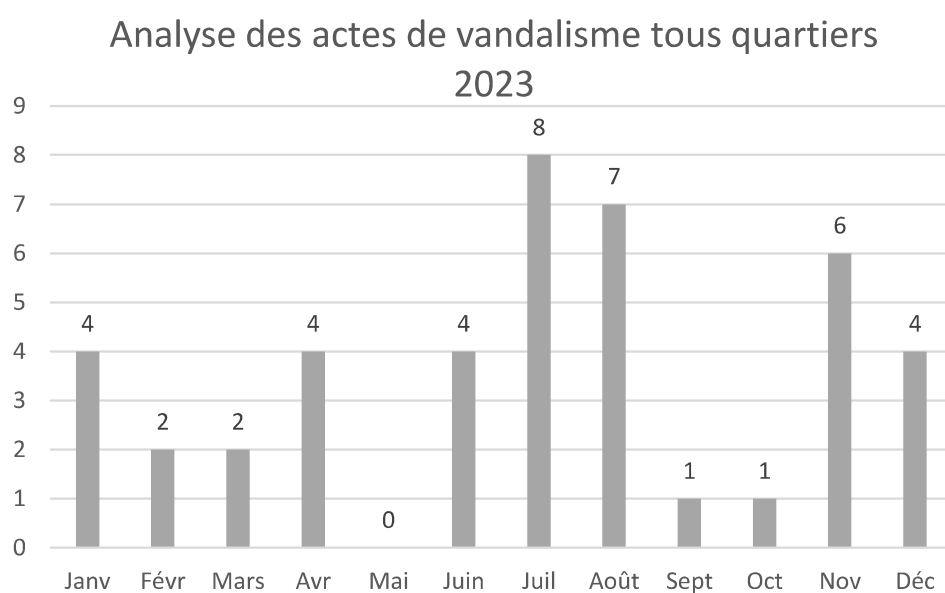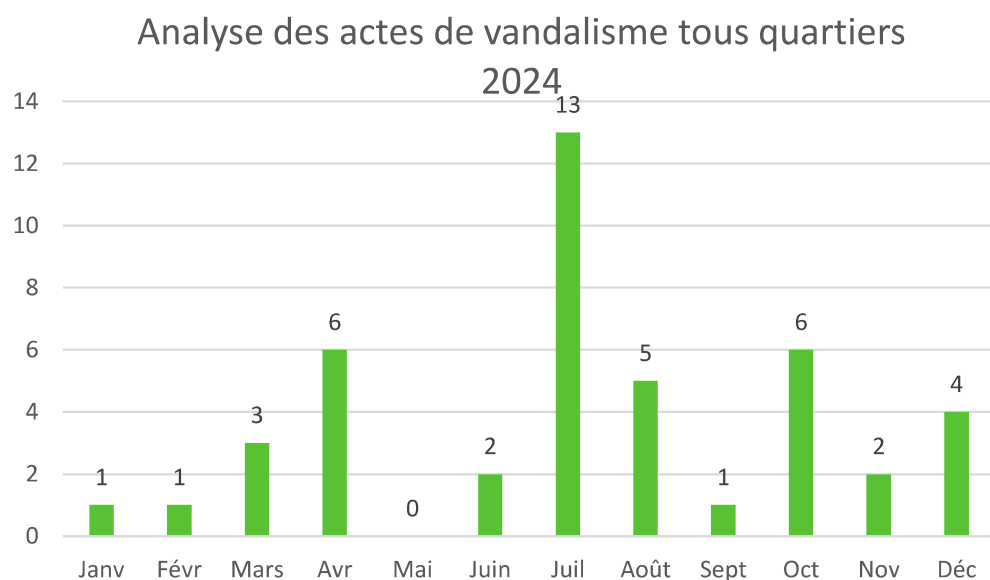


Analyse Vandalisme par quartier (G2+G3)


Analyse vandalisme par quartiers G2-G3 2024

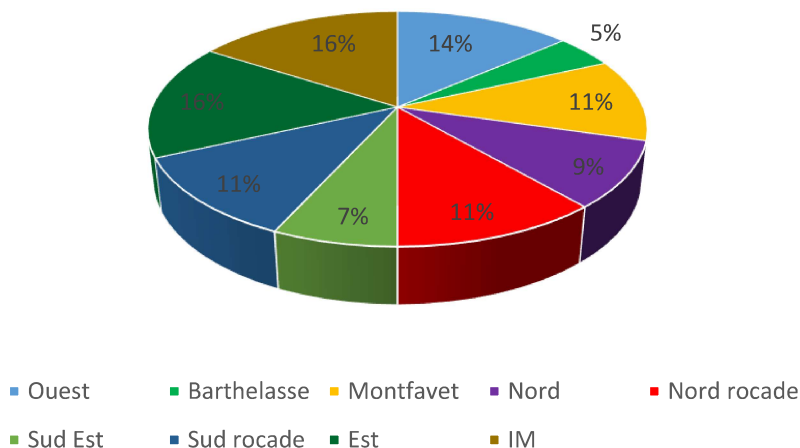

Analyse vandalisme par quartier G2-G3 2023

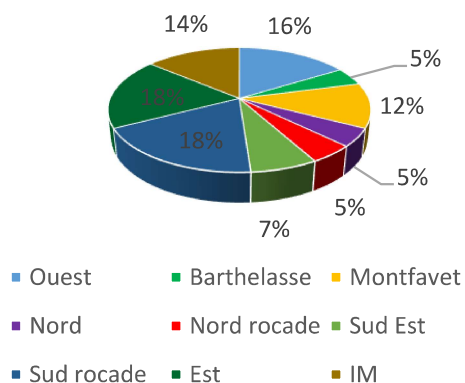

Analyse vandalisme par quartier G2-G3 2022

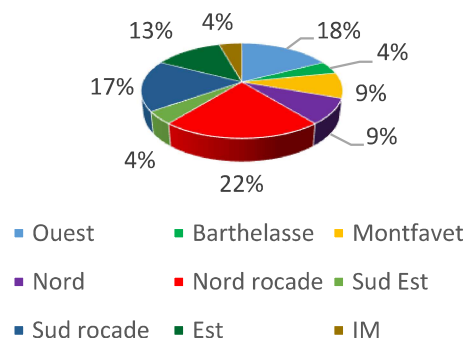

•Bilan annuel 2024

- En 2024, le nombre de foyers éclairés atteindra 20 450, ce qui représente une hausse de 2 % par rapport au début du contrat.
 - Trois types de sources lumineuses sont présents dans des proportions supérieures à 30 %. Sodium haute pression (SHP), Iodures métalliques (IM), LED.
 - Le nombre de Led a augmenté de 12% sur l'année 2024.
 - La puissance moyenne installée par armoire de commande est en diminution de 7 % sur l'exercice,
 - Le nombre de demandes ne concernant pas le réseau d'éclairage public est en diminution de 2,8%
 - Le nombre d 'intervention est quant à lui stable sur l'année 2024
- Les incidents de réseaux ont diminué de 40%.
- Les actes de vandalisme sont augmentation par rapport à l'an dernier,
 - Le nombre de sinistres est stable.

2. 3 Maintien du patrimoine

ACTIVITÉ

Maintien du patrimoine

POSTE G3

Compte rendu de l'exécution du poste G3 AVIGNON/GRAND AVIGNON

Compte rendu de l'exécution du poste G3

Analyse de l'exécution du programme :

	AVIGNON	GRAND AVIGNON
Report exercice année 2024:	-24 115,20	121,65
Total Report année 2023:	-24 115,20	121,65
Montant poste G3 année 2024 :	150 000,00	20 000,00
Crédit pour l'année 2024:	125 884,80	20 121,65
Travaux G3 exécutés en 2024 :	134 425,51	20 121,65
Solde au 31/12/2024 :	-8 540,71	0,00
Produit remboursement sinistres 2024:	0,00	0,00
Solde G3 au 31/12/2024:	-8 540,71	0,00

Consommation enveloppe G3

Ville d' AVIGNON:

- 57% pour remise en état suite à des sinistres.
- 12% pour remise en état suite à des actes de vandalisme.
- 1% pour des travaux de renouvellement.
- 30% pour la réalisation de travaux d' amelioration à la demande du maître d'ouvrage.


GRAND AVIGNON:

- 100% pour remise en état suite à des sinistres.
- 0% pour remise en état suite à des actes de vandalisme.
- 0% pour des travaux de renouvellement.
- 0% pour la réalisation de travaux d' amelioration à la demande du maître d'ouvrage


ACTIVITÉ
Maintien du patrimoine
POSTE G3

Compte rendu de l'exécution du poste G3
AVIGNON/GRAND AVIGNON

Analyse des interventions AVIGNON 2024 (nombre total)

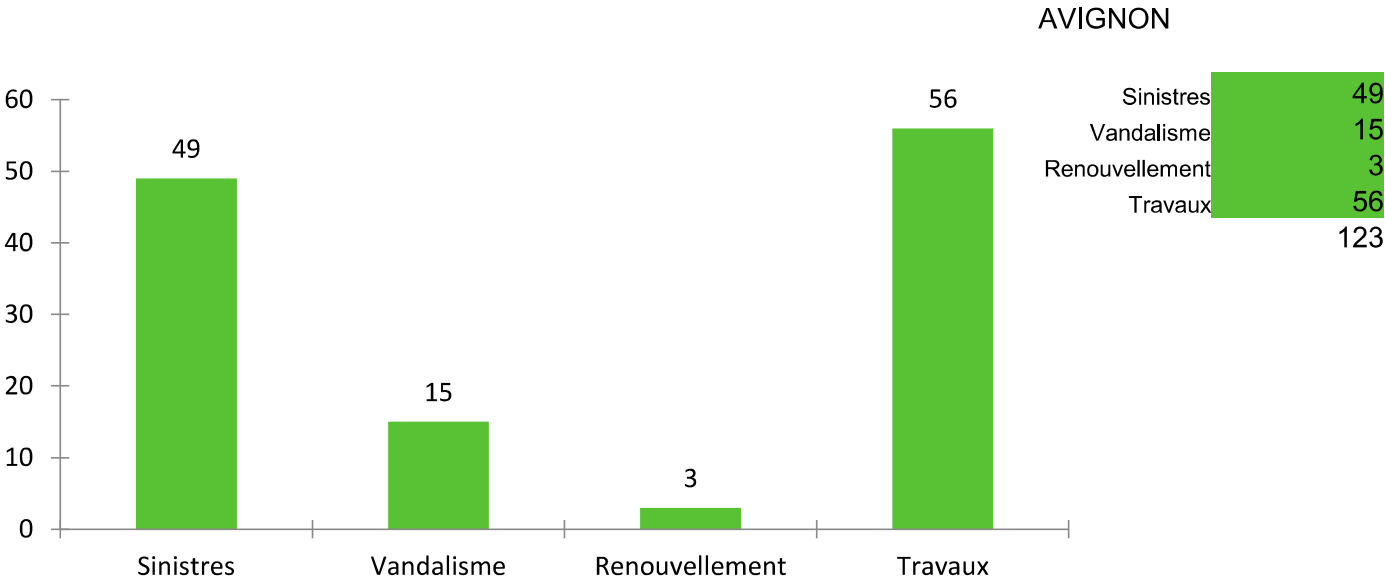

Analyse des interventions AVIGNON 2023 (nombre total)

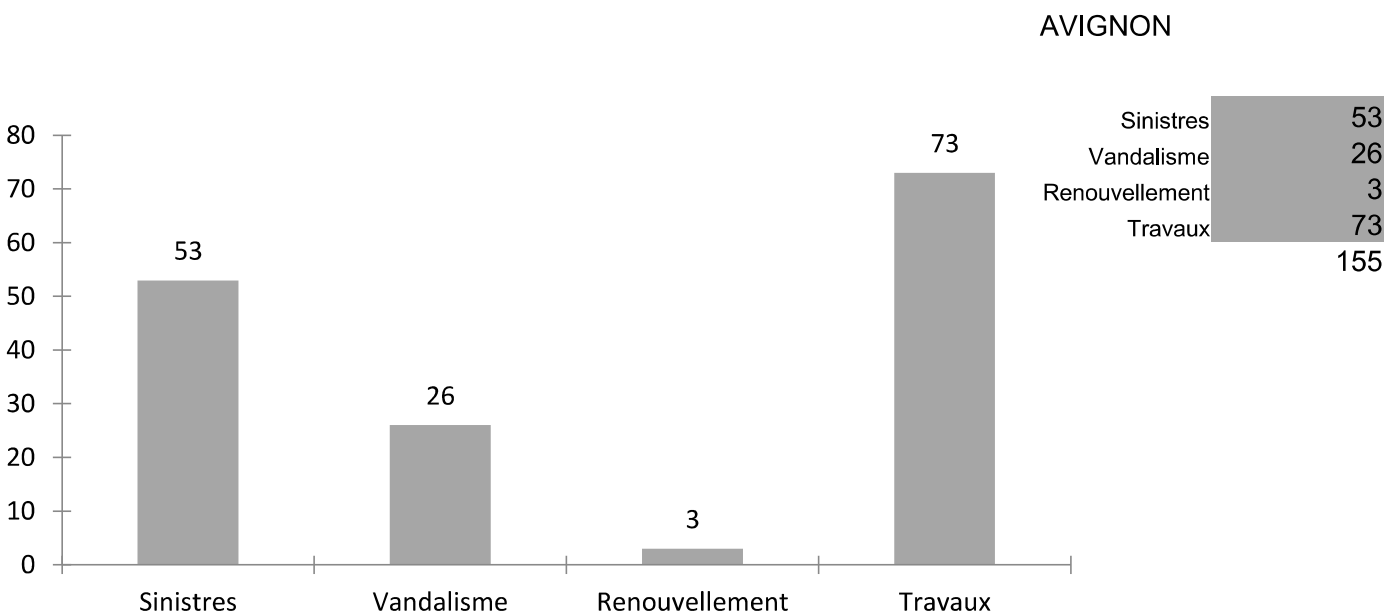

ACTIVITÉ


Maintien du patrimoine

POSTE G3


Compte rendu de l'exécution du poste G3

AVIGNON/GRAND AVIGNON

Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2024 (nombre total)

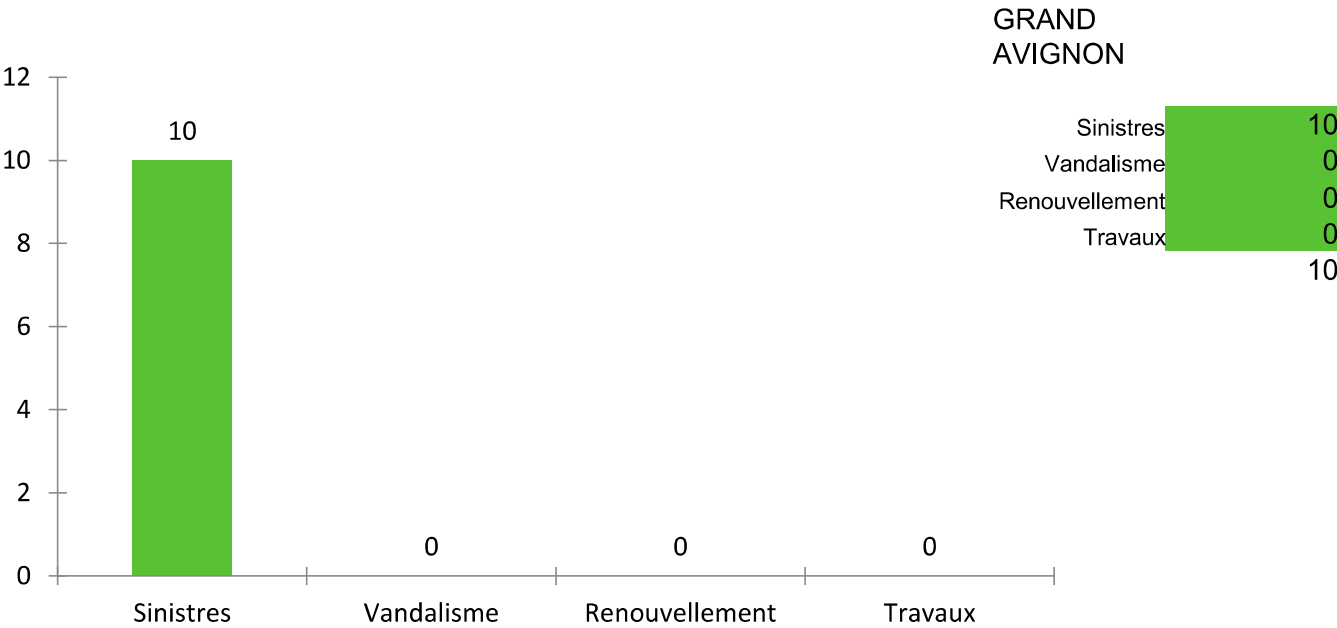


Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2023 (nombre total)

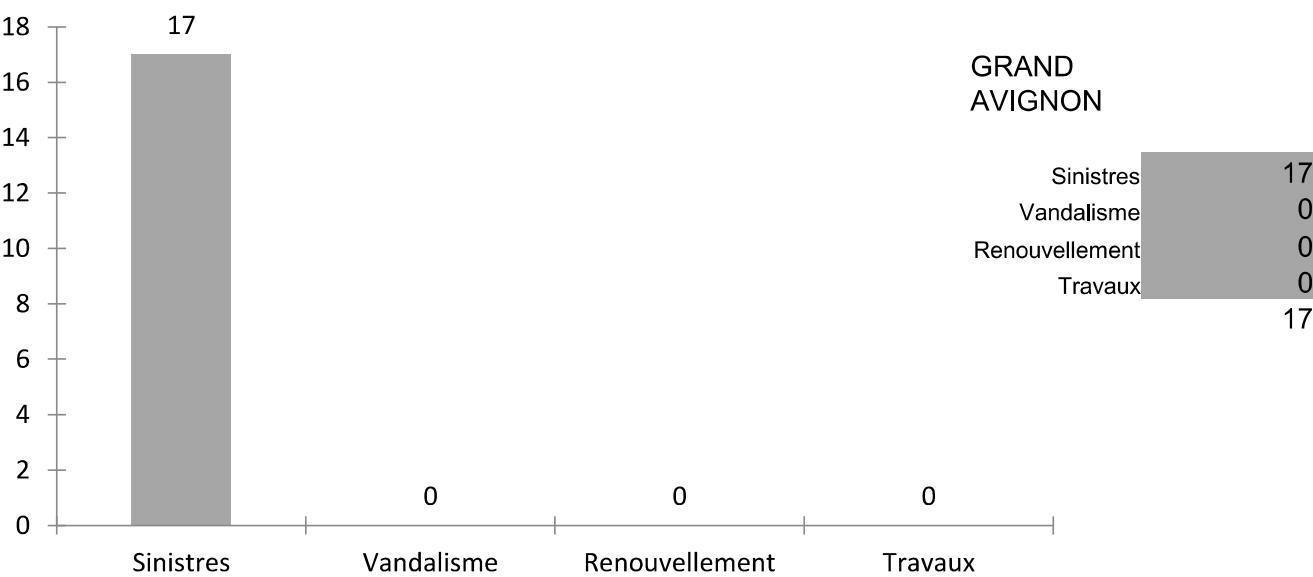

Analyse des interventions AVIGNON 2024 (montant)

Avignon


Sinistres	76304,89
Vandalisme	16571,31
Renouvellement	1824,03
Travaux	39725,28
	134425,51

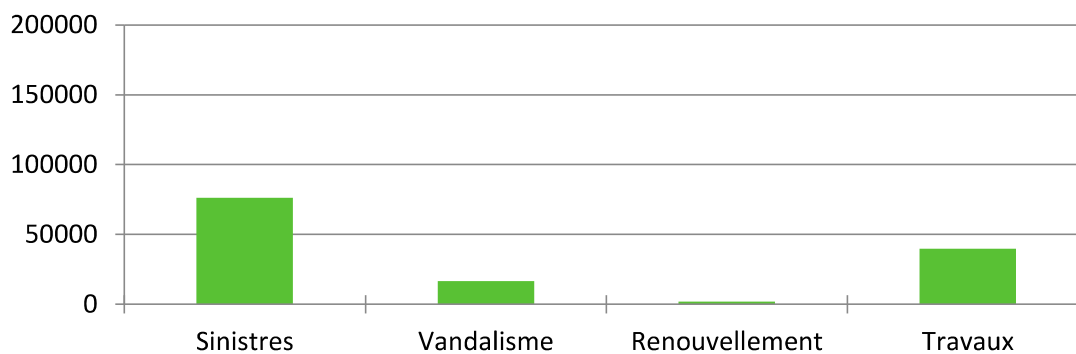

Analyse des interventions AVIGNON 2023 (montant)


Avignon

Sinistres	62640,21
Vandalisme	16431,32
Renouvellement	1143,42
Travaux	63524,18
	143739,13

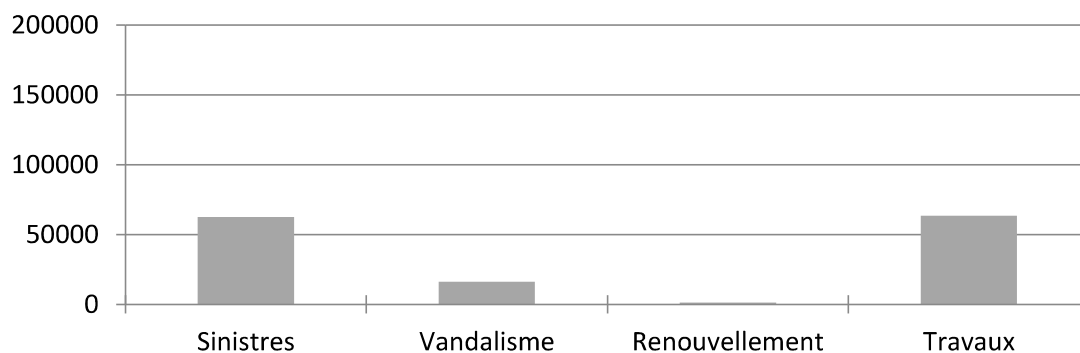


Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2024 (montant)

GRAND AVIGNON	
Sinistres	20121,65
Vandalisme	0
Renouvellement	0
Travaux	0
	20121,65

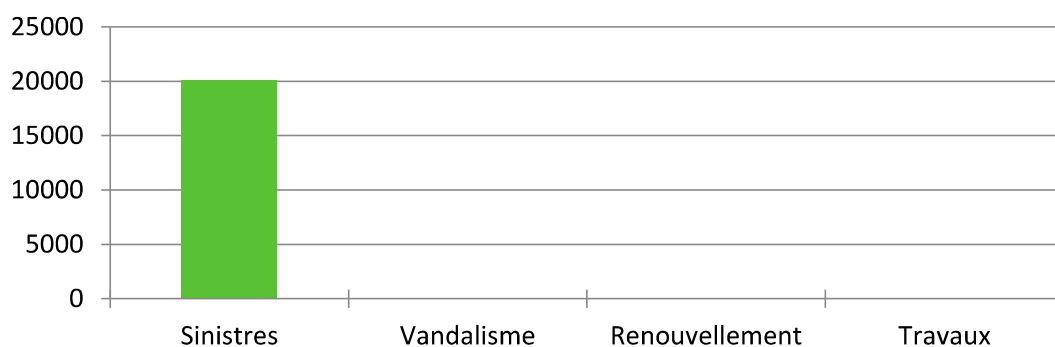


Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2023 (montant)


GRAND AVIGNON	
Sinistres	20561,46
Vandalisme	0
Renouvellement	0
Travaux	0
	20561,46

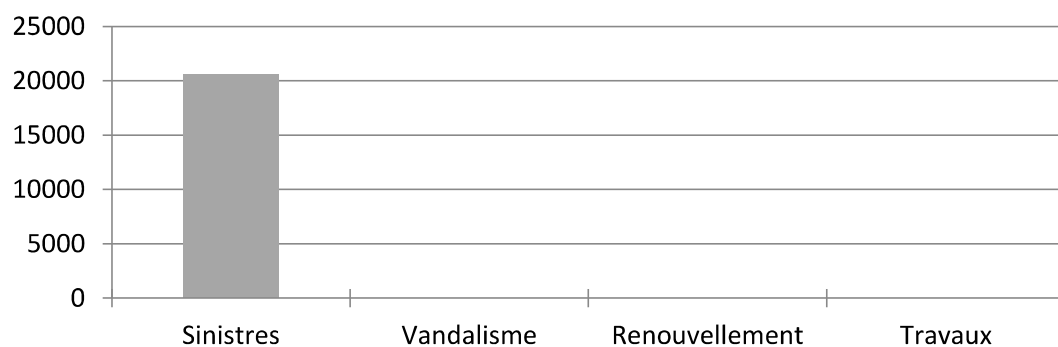

Analyse des interventions totalité du réseau AVIGNON/GRAND AVIGNON 2024 (montant)

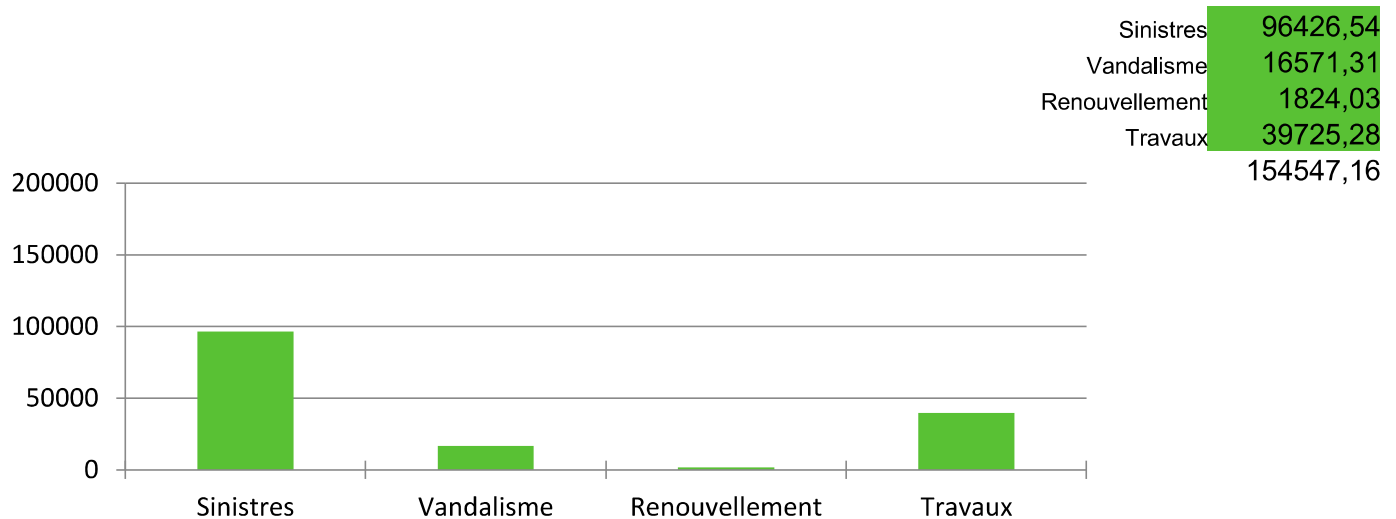

Analyse des interventions totalité du réseau AVIGNON/GRAND AVIGNON 2023 (montant)

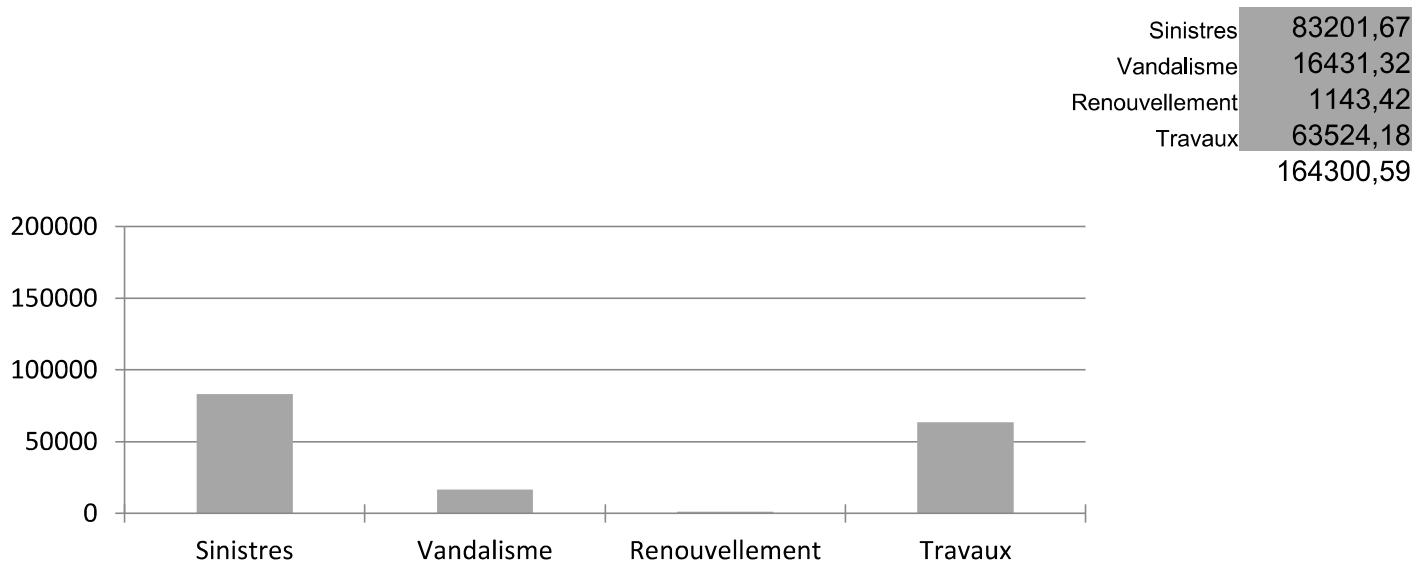


ACTIVITÉ

Maintien du patrimoine

POSTE G3

Analyse des interventions AVIGNON (nombre par catégories)

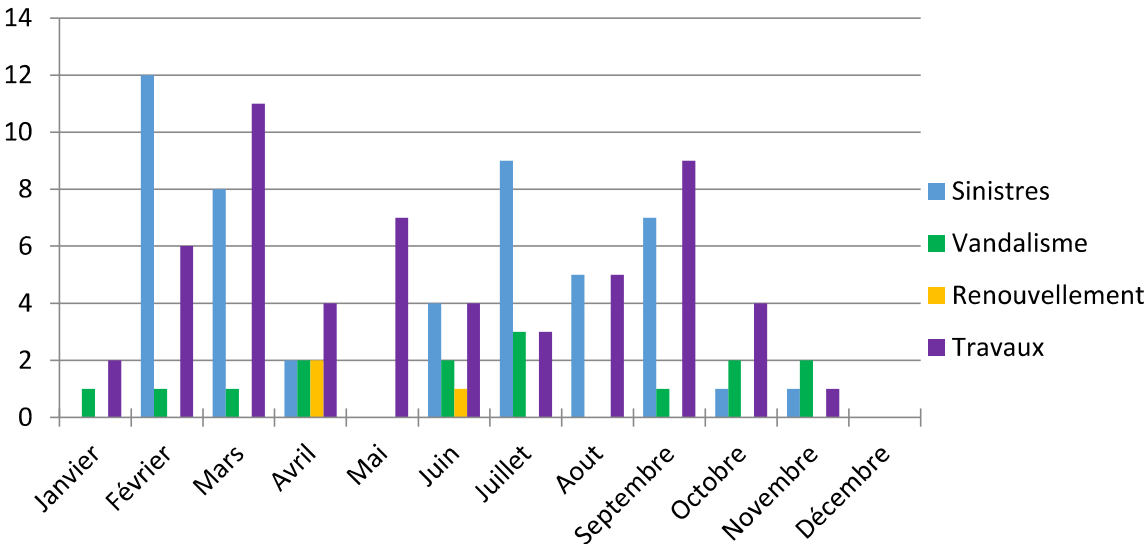


	Sinistres	Vandalisme	Renouvellement	Travaux
Janvier	0	1	0	2
Février	12	1	0	6
Mars	8	1	0	11
Avril	2	2	2	4
Mai	0	0	0	7
Juin	4	2	1	4
Juillet	9	3	0	3
Aout	5	0	0	5
Septembre	7	1	0	9
Octobre	1	2	0	4
Novembre	1	2	0	1
Décembre	0	0	0	0
	49	15	3	56

Récapitulatif interventions 2023				
SINISTRES	VANDALISME	RENOUVELLEMENT	TRAVAUX	TOTAL
49	15	3	56	123

Récapitulatif interventions 2023				
SINISTRES	VANDALISME	RENOUVELLEMENT	TRAVAUX	TOTAL
53	26	3	73	155

Analyse des interventions GRAND AVIGNON (nombre par catégories)

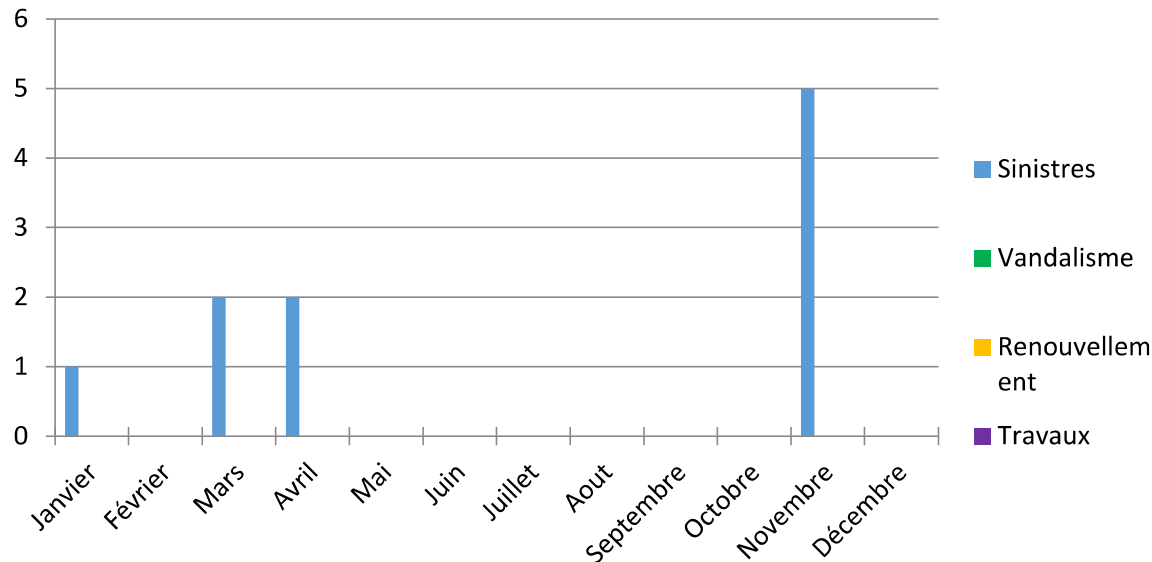

	Sinistres	Vandalisme	Renouvellement	Travaux
Janvier	1	0	0	0
Février	0	0	0	0
Mars	2	0	0	0
Avril	2	0	0	0
Mai	0	0	0	0
Juin	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0
Aout	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0
Octobre	0	0	0	0
Novembre	5	0	0	0
Décembre	0	0	0	0
	10	0	0	0

Rappel interventions 2023				
SINISTRE	VANDALISME	RENOUVELLEMENT	TRAVAUX	TOTAL
10	0	0	0	10

Rappel interventions 2023				
SINISTRE	VANDALISME	RENOUVELLEMENT	TRAVAUX	TOTAL
17	0	0	0	17

ACTIVITÉ
Maintenance du patrimoine
POSTE G3



Compte rendu des travaux poste G3 - 2024

Année 2024	AVIGNON	GRAND AVIGNON
JANVIER	2 430,40	2711,02
FEVRIER	21 797,31	0
MARS	14 644,73	3155,82
AVRIL	10 967,79	1686,18
MAI	5 309,39	0
JUIN	14 442,93	0
JUILLET	26 308,42	0
AOUT	12 261,59	0
SEPTEMBRE	17 203,65	0
OCTOBRE	4 538,00	0
NOVEMBRE	4 521,30	9028,98
DECEMBRE	0,00	3539,65
TOTAL HT:	134 425,51	20 121,65

Analyse du G3 Vandalisme par quartier

	Janv	Fév	Mars	Avrl	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Totaux
Intra-muros						3 752,50				1 758,75			5 511,25
Est		116,31							1 048,47	224,00	562,95		1 951,73
Ouest	1 462,40			408,23									1 870,63
Barthelasse													0,00
Montfavet				779,53									779,53
Nord							330,95				1 278,35		1 609,30
Nord Rocade			1 029,27										1 029,27
Sud est													0,00
Sud rocade							2 819,60						2 819,60
	1 462,40	116,31	1 029,27	1 187,76	0,00	3 752,50	3 150,55	0,00	1 048,47	1 982,75	1 841,30	0,00	15 571,31

Répartition 2024

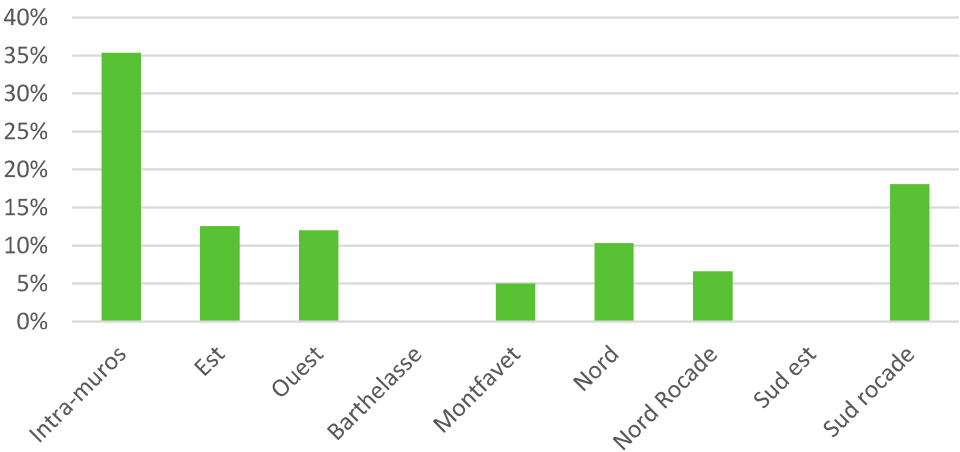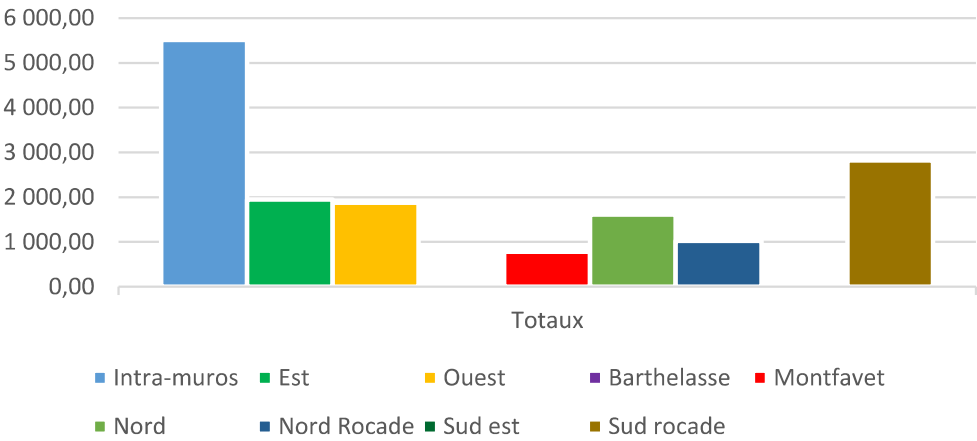

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

2. 4 Travaux préfinancés

TRAVAUX PREFINANCES

Travaux (poste G4)

Ces travaux comprennent notamment :

- Le génie-civil.
- Le remplacement des mâts et luminaires vétustes.
- La mise en sécurité des installations pour la préservation des personnes et des travailleurs.
- La mise aux normes réglementaires.
- L'installation ou la modification de nouvelles mises en valeur.

Ces travaux amènent donc une augmentation de la valeur patrimoniale des installations de la ville et un allongement de leurs durées de vie moyenne. Ils sont par conséquent imputables sur la section investissement.



PROGRAMME reconstruction 2025-2027

PROGRAMME TRAVAUX 2025-2027

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	Calendrier
815	OULLE ALLEE DE L'	Ville	2026
1000	RHONE BD DU	Ville	2026
1071	SAINT-LAZARE BRD	Ville	2027
644	LIGNE QU. DE LA	Ville	2027

SUIVI DE L ENVELOPPE G4 PHASE DIFFEREE
VILLE D'AVIGNON

Année			Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
	Budget contrat en €	3 133 777,85	1 186 898,15	876 563,81	42 728,40	60 005,46	967 582,03
		Montant € HT	€	€	€	€	€
2015		364 021,55	321 293,15		42 728,40		
2016		259 512,61	179 824,99	79 687,62			
2017		85 865,50	6 177,88	79 687,62			
2018		79 687,62	0,00	79 687,62			
2019		79 687,62	0,00	79 687,62			
2020		198 807,46	119 119,84	79 687,62			
2021		196 790,62	117 103,00	79 687,62			
2022		286 414,21	98 403,33	79 687,62			108 323,26
2023		381 081,20	105 480,58	79 687,62			195 913,00
2024		348 011,65	77 247,65	79 688,00			191 076,00
	Totaux:	2 279 880,04	1 024 650,42	717 188,96	42 728,40	0,00	495 312,26
			Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	Couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
	Total Réalisation HT:	2 279 880,04	1 024 650,42	717 188,96	42 728,40	0,00	495 312,26
	Solde restant à dispositio n ht:	853 897,81	162 247,73	159 374,85	0,00	60 005,46	472 269,77

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
24	ALFRED BERGIER RUE	Ville	Dif	Implicite	10 711,60	2024
214	CHANTEREINE BRD	Ville	Dif	Implicite	5 622,38	2024
657	LOUIS BICHERON RUE	Ville	Dif	Implicite	5 114,80	2024
954	PRETENTAIN RUE DE LA	Ville	Dif	Implicite	7 602,48	2024
1217	VJRO SOULEU RUE	Ville	Dif	implicite	11 212,74	2024
1004	RIVANS BRD DES	Ville	NR	implicite	4 831,38	2024
113	BAVARDAGES RUE DES	Ville	Dif	implicite	3 513,99	2024
146	BONAPARTE RUE	Ville	Dif	implicite	10 091,46	2024
566	JEAN MOULIN RUE	Ville	Dif	implicite	4 552,51	2024
658	LOUIS BRUHAT RUE	Ville	Dif	implicite	1 889,68	2024
1006	ROBERT BLANC PCE	Ville	Dif	Implicite	6 819,73	2024
1271	LOUVRES RUE DE	Ville	Dif	Implicite	5 284,90	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER						
Ville d'Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
2	14 JUILLET RUE DU	Ville	GER	Implicite	709,00	2024
5	58ème R.I.DU RUE	Ville	GER	Implicite	938,00	2024
13	ALBERT CHABAUD RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
19	ALEX DE RHODES PCE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
20	ALEXANDRE BLANC RUE	Ville	GER	Implicite	1 854,00	2024
21	ALEXANDRE CALVET IMP	Ville	GER	Implicite	572,00	2024
34	ALPILLES RUE DES	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
41	AMBROISE PARE RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
46	AMPERE RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
48	ANATOLE FRANCE BRD	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
49	ANCIENNE TANNERIE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	286,00	2024
55	ANDROUNO ALLEE DE L'	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
56	ANGLAISE CHE DE L'	Ville	GER	Implicite	927,00	2024
62	ANNIBAL CECCANO RUE	Ville	GER	Implicite	2 400,00	2024
65	ANTOINE LE MOITURIER RUE	Ville	GER	Implicite	927,00	2024
66	ANTOINE PEYROL RUE	Ville	GER	Implicite	812,00	2024
68	ARAGONNAIS PCE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
71-2	ARCUSSI BRD	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
76	ARMISTICE BRD DE L'	Ville	GER	Implicite	1 293,00	2024
80-2	ARROUSAIRE AVE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 751,00	2024
87	AUGUSTE CHABAUD RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
89	AUGUSTE DUMAS RUE	Ville	GER	Implicite	2 449,00	2024
104	BARCELONA RUE DE	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
105	BARLES-BONNET IMP	Ville	GER	Implicite	286,00	2024
107-2	ROUTE DE L'ISLON	Ville	GER	Implicite	2 987,00	2024
109	BASILIC RUE DU	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
118	BEL AIR IMP DU	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
120	BELLE DE JOUR RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
123	BENOIT 12 RUE	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
127	BERLINGUE IMP	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
134	BIR-HAKEIM RUE DE	Ville	GER	Implicite	927,00	2024
140-2	BLUM RUE LEON	Ville	GER	Implicite	503,00	2024
147	BONAVENTURE AVE DE	Ville	GER	Implicite	1 751,00	2024
149	BONNET-CAILLOD IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
152	BORODINE PCE	Ville	GER	Implicite	720,00	2024
169	CABRIERE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 545,00	2024
171	CALMETTE ALBERT IMP	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
173	CAMBIS CHEMIN DE	Ville	GER	Implicite	1 139,00	2024
175-2	CAMELIAS DES RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
185	CAP DE VILLA BRD	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
187	CAPUCINES RUE DES	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
188	CAPUCINS IMP DES	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
199	CASSIN RUE RENE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
202	CATALANS RUE DES	Ville	GER	Implicite	984,00	2024
210	CHAMPS IMP DES	Ville	GER	Implicite	673,60	2024
212	CHANNEY RUE JEHAN DE	Ville	GER	Implicite	800,00	2024
217	CHARCOT RUE CDT	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
218	ROCADE CHARLES DE GAULLE (Est)	GA	GER	Implicite	103,00	2024
219	CHARLES GOUNOD RUE	GA	GER	Implicite	1 758,60	2024
235	CHOPIN RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2024
236	CICERONE IMP	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
243	CLAIRE-FONTAINE RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
1038-2	SAINT CHARLES RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
248	CLEMENT 6 PCE	Ville	GER	Implicite	366,00	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER						
Ville d'Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
253	CLOS DU TRAMS BRD	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
257	CLOVIS HUGUES RUE	Ville	GER	Implicite	800,00	2024
259	COLIBRI RUE DU	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
264	COLMAR BRD DE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
266	COMBE RUE	Ville	GER	Implicite	720,00	2024
268	COMMANDANT GEORGES HOUOT RUE	Ville	GER	Implicite	800,00	2024
271	COMTAT VENAISSIN AVE DU	Ville	GER	Implicite	675,00	2024
272	COMTE DU DEMAINE RUE DU	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
287	COUPE-D'OR CHE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 030,00	2024
293	CRIS VERTS CHE DES	Ville	GER	Implicite	2 163,00	2024
296	CROIX DES OISEAUX AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	2 758,00	2024
298	CROIX ROUGE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	5 436,00	2024
300	CROIX VERTE CHE DE LA	Ville	GER	Implicite	824,00	2024
306-2	DAHLIAS RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
308	DAME DOMINIQUE IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
320	DEUX FRERES CHE DES	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
323	DIANE DE POITIERS RUE	Ville	GER	Implicite	549,00	2024
325	DIORBEL RUE DE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
328	DOCTEUR GEOFFROY RUE DU	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
334	DROITS DE L'HOMME RUE DES	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
340-2	DURANCE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	2 563,00	2024
343	ÉCOLES IMP DES	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
352	ÉLIE DE TALLEYRAND RUE	Ville	GER	Implicite	1 040,00	2024
354	ELSIE KUHN LEITZ RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
355	ELZEARD GENET RUE	Ville	GER	Implicite	824,00	2024
360	ENGUERRAND QUARTON RUE	Ville	GER	Implicite	389,00	2024
363	ÉRABLES RUE DES	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
364	ÈREVAN RUE D'	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
365-2	ERNEST FEUILLET IMP	Ville	GER	Implicite	560,00	2024
366	ERNEST TEISSIER RUE	Ville	GER	Implicite	1 018,00	2024
371	ESPIQUE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
372	ESPRIT REQUIEM RUE	Ville	GER	Implicite	698,00	2024
374	ESTIENNE D'ORVES RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
379	EUGENE SUE IMP.	Ville	GER	Implicite	583,00	2024
382	FARANDOLE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	938,00	2024
384	FAURE - AYMARD BRD	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
385	FAURE FELIX RUE	Ville	GER	Implicite	183,00	2024
387	FAVOT IMP	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
388	FELIBRIGE PCE DU	Ville	GER	Implicite	1 040,00	2024
392	FERDINAND BEC AVE	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
393	FÉRIGOULE BRD	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
398	FLAMMARION RUE	Ville	GER	Implicite	1 213,00	2024
400	FLEURS ALLEE DES	Ville	GER	Implicite	286,00	2024
408	FOCH BRD	Ville	GER	Implicite	824,00	2024
410	FOLIE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
413	FONT-SEGUGNE RUE	Ville	GER	Implicite	286,00	2024
419	FRAIGIERE AVE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
423	FRANCOIS 1er RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
424	FRANCOIS ARAGO RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
427	FRANCOIS JOUVE RUE	Ville	GER	Implicite	720,00	2024
433	FRERE SAVININ RUE DU	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
441	GABRIEL PERI RUE	Ville	GER	Implicite	572,00	2024
443	GAI SAVOIR RUE DU	Ville	GER	Implicite	800,00	2024
453	GARANCE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
454	GARDIAN RUE DU	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
462	GENEVRIER RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 133,00	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER						
Ville d'Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
466-2	GEORGES CLEMENCEAU BRD	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
474	GIRART DE ROUSSILLON CHE	Ville	GER	Implicite	846,00	2024
510	HALAGE CH.DE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
481-2	GOUNOD IMP	Ville	GER	Implicite	446,00	2024
483-2	GRAND PARADIS PLACE DU	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
488	GRANGE D'OREL RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 533,00	2024
489	GRANIER CLAUDE RUE	Ville	GER	Implicite	663,00	2024
497	GRIEG RUE	Ville	GER	Implicite	960,00	2024
503	GUILLAUME DE MACHAULT RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
506	GUSTAVE COURBET RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
508	GUYNEMER RUE	Ville	GER	Implicite	824,00	2024
512	HAURIOU RUE MAURICE	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
519	HENRI DUNANT BRD	Ville	GER	Implicite	480,00	2024
520	HENRI GUIGOU RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
525	HENRY FRENAY RUE	Ville	GER	Implicite	880,00	2024
526	HERRIOT RUE EDOUARD	Ville	GER	Implicite	526,00	2024
531	HUGUES DE SADE RUE	Ville	GER	Implicite	800,00	2024
538	IRENE JOLLIOT-CURIE RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
539	IRIS RUE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
546	JACQUES YVERNY RUE	Ville	GER	Implicite	1 133,00	2024
547	JARDINS NEUFS CHE DES	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
548-2	JAS RUE DU	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
549	JASSOT BRD	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
555	JEAN ARNAUD RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
556	JEAN BOCCAGE AVE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
558-2	JEAN CATELAS RUE	Ville	GER	Implicite	1 246,00	2024
559-2	JEAN DES FIGUES RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
564	JEAN MACE RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
565	JEAN MERMOZ BRD	Ville	GER	Implicite	824,00	2024
571	JEAN XXII AVE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
575	JEAN-BAPTISTE SEGUIN RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
577	JEAN-CLAUDE CUNDIR RUE	Ville	GER	Implicite	2 575,00	2024
579	JEAN-JOSEPH MOURET RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
747	Mme DE SEVIGNE RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
588	JEAN-SEBASTIEN BACH RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
592	JONQUERETTE RTE DE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
597	JOSEPH PERU RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
612	KLEBER-AUQUIER RUE	Ville	GER	Implicite	1 133,00	2024
613	KRUGER RUE	Ville	GER	Implicite	469,00	2024
614	LABOUREUR DU RUE	Ville	GER	Implicite	720,00	2024
617	LAMARTINE RUE	Ville	GER	Implicite	732,00	2024
631	LEBRUN ALBERT RUE	Ville	GER	Implicite	480,00	2024
633	LEON DUGUIT RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
634	LEON-DE-BERLUC-PERUSSIS PCE	Ville	GER	Implicite	915,00	2024
636	LEVANT AVE DU	Ville	GER	Implicite	927,00	2024
643	LIEUT. MARCEL SOULIER AVE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1335	FABRE D' EGLANTINE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
656	LOUIS BARTHO AVE	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
660-2	LOUIS CARPENTRAS IMP.	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
668	LOUIS VALAYER RUE	Ville	GER	Implicite	880,00	2024
670	LUBERON RUE DU	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
679-2	MALEBRANCHE RUE NICOLAS DE	Ville	GER	Implicite	720,00	2024
680	MALPEIGNE CHE DE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
685	MARC SANGNIER RUE	Ville	GER	Implicite	549,00	2024
687	MARCEL COMBE BRD	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
690	MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY AVE DU	Ville	GER	Implicite	1 184,50	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
703	MARQUIS DE CALVIERES RUE	Ville	GER	Implicite	400,00	2024
705	MARSEILLE ROUTE DE	Ville	GER	Implicite	10 185,00	2024
711	MASSILLARGUES CHE DE	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
720	MAURICE CHAM BONNET RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
724	MAZARIN AVE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
730	METZ BRD DE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
743-2	MISSAK MANOUCHIAN RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
745	MISTRAL FREDERIC RUE	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
751	MOLINAS IMP	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
753	MOLLET RUE GUY	Ville	GER	Implicite	400,00	2024
754-2	MONCLAR AVE	Ville	GER	Implicite	3 817,20	2024
755	MONIER-ROCHE IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
760	MONT SEREIN AVE DU	Ville	GER	Implicite	927,00	2024
761	MONT VENTOUX RUE DU	Ville	GER	Implicite	2 184,00	2024
765	MONTPLAISIR AVE	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
766-2	MONTPLAISIR IMP	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
772	MOULIN NEUF CHE DU	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
773-2	MOULIN NOTRE DAME AVE DU	Ville	GER	Implicite	1 957,00	2024
776	MOURIES IMP	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
778-2	MOZART RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
640	LIBERTE BRD DE LA	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
781	MUSETTE IMP	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
783	NATIONALE RUE	Ville	GER	Implicite	560,00	2024
784	NEUF PEYRES CHE DES	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
789	NICOLAS FROMENT RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
799	NORMANDIE NIEMEN RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
807-2	OMER FRANCOIS RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
810	ORIENT BRD D'	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
812	ORIGAN RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
733	MICHEL GOUTIER PCE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
818	PAGE DRAGONNET RUE DU	Ville	GER	Implicite	446,00	2024
824	PAPALINES RUE DES	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
1125	TARRAGONA RUE DE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
832	PASERELLE CHE DE LA	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
837	PAUL BAGNOL RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
844	PAUL MARIETON BRD	Ville	GER	Implicite	732,00	2024
845	PAUL PAMARD RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
847-2	PAUL RAMADIER RUE	Ville	GER	Implicite	302,00	2024
849	PAUL-JOSEPH IMP	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
852	PEDRO-DE-LUNA ALLEE	Ville	GER	Implicite	892,00	2024
853	PEILLARD RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
875	PETIT SAINT-JEAN IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
893-2	PHENIX RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
894	PHILIPPE DE CABASSOLLE RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
901	PIERRE BROSOLETTA RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
909	PIERRE GENDRE RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
910	PIERRE LOTI BRD	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
912-2	PIERRE SEMARD AVE	Ville	GER	Implicite	446,00	2024
914	PIERRE VILLATTE RUE	Ville	GER	Implicite	961,00	2024
929-2	POINCARE RAYMOND RUE	Ville	GER	Implicite	560,00	2024
945	POUCHELON IMP	Ville	GER	Implicite	469,00	2024
948-2	POUZARAQUE RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2024
953	PRESIDENT KENNEDY COURS DU	Ville	GER	Implicite	3 121,80	2024
960	PROVENCALES RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 442,00	2024
969	PUY CHEMIN DU	Ville	GER	Implicite	1 339,00	2024
974-2	QUINZIEME CORPS RUE DU	Ville	GER	Implicite	80,00	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
978	RAINETTES RUE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
980	RAMEAUX IMP DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
995	RENE GOSCINNY RUE	Ville	GER	Implicite	755,00	2024
997	RESISTANCE PCE DE LA	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1007	ROBERT-DE-GENEVE RUE	Ville	GER	Implicite	640,00	2024
1008	ROCCI IMP	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1009-2	ROGER SALENGRO BRD	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
1016	ROMANS IMPASSE ROBIN DE	Ville	GER	Implicite	400,00	2024
1022-2	ROSES DES IMP	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
1043	SAINT GUILLAUME RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2024
1044	SAINT-JEAN LE VIEUX PCE	Ville	GER	Implicite	1 115,20	2024
1049	SAINT PIERRE PCE	Ville	GER	Implicite	657,40	2024
1054	SAINT VERAN IMP	Ville	GER	Implicite	469,00	2024
1055	SAINT VINCENT FERRIER RUE	Ville	GER	Implicite	480,00	2024
1061	SAINTE MARGUERITTE IMP.	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
1066	SAINTE-MARIES ALLEE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
1068	SAINT-GENIEST CHE DE	Ville	GER	Implicite	2 585,00	2024
1069	SAINT-JEAN AVE	Ville	GER	Implicite	2 456,00	2024
1074-2	SAINT-MICHEL CHEMIN	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
1089	SCHUMANN ROBERT RUE	Ville	GER	Implicite	1 647,00	2024
1098	SIENNE PCE DE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
1101	SIMONE MARTINI RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
1102	SIX JUIN 1944 PCE DU	Ville	GER	Implicite	183,00	2024
1110	SOURCES AVE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
1114	STRASBOURG BRD DE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
1122	TARASCON AVE DE	Ville	GER	Implicite	1 613,00	2024
1132-2	THEODORE KING RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
1134-2	THOULOUSE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
1139	TOCO L'ASE CHE	Ville	GER	Implicite	469,00	2024
1140	TOCO L'ASE IMPASSE DU	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
1142-2	TORTOSA RUE DE	Ville	GER	Implicite	366,00	2024
1147	TRAILLE CH. DE LA	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
1152-2	TRILLADE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	3 545,60	2024
1154	TROENES IMP DES	Ville	GER	Implicite	400,00	2024
1170	VENUS D'ARLES RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	2 880,00	2024
1172	VERDUN PCE DE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1185	VIENNOISE IMP	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
1188	VILLAS RUE DES	Ville	GER	Implicite	103,00	2024
1191-2	VINCENT AURIOL RUE	Ville	GER	Implicite	503,00	2024
1192	VINCENT VAN GOGH RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
1193-2	VIOLETTE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	309,00	2024
603-2	JULES FERRY BRD	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
1238	IMP FLAMMARION	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
1239	BARTHELASSE CHEMIN DE LA	Ville	GER	Implicite	721,00	2024
1261	GIRARD SIMONE RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1262	CAMPO BELLO RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1264-2	FALLA RUE DE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
1282-2	MOURET IMP HENRI	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1283-2	CITES LOUIS GROS RUE DES	Ville	GER	Implicite	412,00	2024
1284-2	REYNIER IMP MARCEL	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
1295	TILLEULS IMPASSE DES	Ville	GER	Implicite	160,00	2024
1305-2	PECHERAIES CHEMIN DES	Ville	GER	Implicite	480,00	2024
1316	LE TITIEN RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2024
1322	TAMBOUR D'ARCOLE PLACE DU	Ville	GER	Implicite	263,00	2024
1328	MADELON RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	320,00	2024
1330	LAURIER IMPASSE DU	Ville	GER	Implicite	103,00	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
1331-2	MORIERE RTE DE MFT	Ville	GER	Implicite	1 339,00	2024
1333	BARLES IMPASSE	Ville	GER	Implicite	206,00	2024
1353	JMP JOFFRE	Ville	GER	Implicite	240,00	2024
1371	JMP 6 CHE DE LA BARTHELASSE	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
533-2	ILE PIOT CH. DE L' (complément)	Ville	GER	Implicite	1 120,00	2024
986-2	REINE JEANNE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	732,00	2024
	IMPASSE DES COQUELICOTS	Ville	GER	Implicite	618,00	2024
	RUE ALIXIS CARREL	Ville	GER	Implicite	80,00	2024
	RUE BLAISE DE PAGAN	Ville	GER	Implicite	1 297,50	2024

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
486	GRANDE MEUSE RUE	Ville	Dif	Implicite	7 893,60	2023
1010	ROI RENE RUE DU	Ville	Dif	Implicite	16 798,46	2023
389	FELICIEN DAVID RUE	Ville	Dif	Implicite	7 465,98	2023
610	JUMELAGES ALLEE DES	Ville	Dif	Implicite	1 167,32	2023
764	MONTFAVET RTE DE	Ville	Dif	Implicite	51 785,56	2023
473	GILBERT-CESBRON RUE	Ville	Dif	Implicite	2 273,24	2023
504	GUILLAUME ERNEST GREVE IMP.	Ville	Dif	Implicite	4 249,76	2023
623	LAURE MALCLES IMP.	Ville	Dif	Implicite	5 045,73	2023
624	LAURENT FAUCHIER RUE	Ville	Dif	Implicite	8 800,93	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
1	11 NOVEMBRE RUE DU	Ville	GER	Implicite	286,00	2023
4	27EME RTA AVE	Ville	GER	Implicite	523,00	2023
5	58ème R.I.DU RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2023
7	ABBE REQUIN PIERRE HENRI RUE	Ville	GER	Implicite	2 643,00	2023
8	ABELLES IMP DES	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
45	AMOUYER RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
35	ALSACE IMP	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
142	BON MARTINET RUE DU	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
42	AMEDEE REY BRD	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
44	AMIRANDE PCE DE L'	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
53	ANDRE HALLAYS RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
60	ANNANELLE RUE D'	Ville	GER	Implicite	990,80	2023
73	ARMAND DE PONTMARTIN RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2023
80	ARROUSAIRE AVE DE L'	Ville	GER	Implicite	618,00	2023
84	ASTREE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
88	AUGUSTE DAMIAN RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
95	AZALAIS MARTIN RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
99	BALANCE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	2 087,60	2023
100	BANASTERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 760,00	2023
106	BARONI IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
108	BASILE RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2023
110	BASSINET RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2023
111	BASTET RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
122	BENEZET BRUNEAU RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
130	BERTHELOT RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2023
131	BERTRAND DE NOGAYROL RUE	Ville	GER	Implicite	1 030,00	2023
132	BERTRAND RUE	Ville	GER	Implicite	880,00	2023
136	BLANCHISSAGE AVE DU	Ville	GER	Implicite	2 314,00	2023
141	BOEUF IMP	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
150	BONNETERIE RUE	Ville	GER	Implicite	720,00	2023
153	BOUQUERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2023
159	BOUSSINGAULT RUE	Ville	GER	Implicite	578,80	2023
161	BOYER RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
179	CAMPANE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	800,00	2023
186	CAPIT.L'HERMINIER AVE	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
196	CARRIERE IMPASSE DE LA	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
	CASTELLIAU IMPASSE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
207	CHAMPFLEURY BRD	Ville	GER	Implicite	420,20	2023
208	CHAMPFLEURY IMP	Ville	GER	Implicite	523,20	2023
209	CHAMPFLEURY TSE	Ville	GER	Implicite	238,60	2023
211	CHANGE PCE DU	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
216	CHAPEAU ROUGE RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 744,60	2023
222	CHARLOUN - RIEU RUE	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
226	CHATAIGNES PCE DES	Ville	GER	Implicite	560,00	2023
234	CHIRON RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
235	CHOPIN RUE	Ville	GER	Implicite	1 213,20	2023
1038	SAINT CHARLES RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
254	CLOS MONPLAISIR BRD	Ville	GER	Implicite	3 502,00	2023
256	CLOS ST-NICOLAS RUE DU	GA	GER	Implicite	2 053,60	2023
262	COLLEGE DE LA CROIX RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2023
277	COMTADINE RUE	Ville	GER	Implicite	570,60	2023
281	CORNEILLE RUE	Ville	GER	Implicite	412,00	2023
288	COURTE LIMAS RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
299	CROIX RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	793,00	2023
302	CROUSILLAT ANTOINE RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER						
Ville d'Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
1210	ANTOINE PINAY ALL	Ville	GER	Implicite	3 360,00	2023
327	DOCTEUR COLOMBE RUE	Ville	GER	Implicite	1 351,60	2023
336	DU MONS RUE	Ville	GER	Implicite	698,00	2023
339	DUMAS ADOLPHE ALLEE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
340	DURANCE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	515,00	2023
389	FELICIEN DAVID RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
365	ERNEST FEUILLET IMP	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
367	ESCALIERS ST ANNE RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 040,00	2023
815	OULLE ALLEE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 280,00	2023
376	ETIENNE MARTELANGE AVE	Ville	GER	Implicite	4 575,00	2023
378	ETROITE RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
386	FAVART RUE	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
395	FERRUCE RUE	Ville	GER	Implicite	560,00	2023
1000	RHONE BD DU	Ville	GER	Implicite	1 600,00	2023
407	FLOUREGE IMP DU	Ville	GER	Implicite	572,00	2023
415	FORET RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
416	FOUR DE LA TERRE RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2023
417	FOUR RUE DU	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
418	FOURBISSEURS RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 120,00	2023
426	FRANCOIS FAVIER RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
432	FRERE BENOIT RUE DU	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
444	GAL RUE DU	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
445	GALANTE RUE	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
448	GALOUBET IMP DU	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
451	GAMBETTA IMP	Ville	GER	Implicite	343,00	2023
460	GAZELLE IMP DE LA	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
464	GEORGES BIZET AVE	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
466	GEORGES CLEMENCEAU BRD	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
477	GOELANDS RUE DES	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
485	GRANDE FUSTERIE RUE	Ville	GER	Implicite	800,00	2023
490	GRAS FELIX RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
491	GRAS IMP J.P.	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
492	GRAVIERE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	467,50	2023
502	GUILLABERT IMP	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
505	GUILLAUME PUY RUE	Ville	GER	Implicite	729,20	2023
516	HENRI BERAUD RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
529	HORLOGE PCE DE L'	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
537	INFIRMIERES RUE	Ville	GER	Implicite	1 327,00	2023
542	JACOB RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2023
548	JAS RUE DU	Ville	GER	Implicite	800,00	2023
558	JEAN CATELAS RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
559	JEAN DES FIGUES RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
564	JEAN MACE RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2023
569	JEAN VEYRIER RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
570	JEAN VILAR RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
574	JEAN-BAPTISTE MARCET RUE	Ville	GER	Implicite	1 634,80	2023
583	JEAN-MARIE RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2023
585	JEANNE D'ARC IMP	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
588	JEAN-SEBASTIEN BACH RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
589	JERUSALEM PLACE	Ville	GER	Implicite	634,40	2023
592	JONQUERETTE RTE DE	Ville	GER	Implicite	618,00	2023
599	JOSEPH SAUTEL RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
602	JULES BOISSIERES RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
615	LAFARE RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
619	LANTERNE RUE	Ville	GER	Implicite	558,60	2023
622	LAURE DE NOVES IMP	Ville	GER	Implicite	412,00	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
632	LEDRU ROLLIN RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2023
635	LESCURE IMP	Ville	GER	Implicite	926,00	2023
646	LIMASSET RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2023
652	LONDE RUE	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
663	LOPY CHEMIN DE	Ville	GER	Implicite	1 348,80	2023
663	LOUIS GUIGNARD RUE	Ville	GER	Implicite	571,00	2023
554	JEAN ANDRE BORDE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
674	LYONNAIS DES RUE	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
676	MAGNOLIA RUE DU	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
682	MANTEL RUE	Ville	GER	Implicite	515,00	2023
686	MARCEL ADRIEN RUE	Ville	GER	Implicite	578,80	2023
689	MARCHANDS RUE DES	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
693	MARIE MADELEINE RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2023
697	MARIUS ANDRE RUE	Ville	GER	Implicite	887,80	2023
698	MARIUS FOUSSON RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
737	MI-GRENIER RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2023
742	MIREILLE IMP	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
746	MIXTE IMP	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
750	MOLIERE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
752	MOLINO IMP	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
754	MONCLAR AVE	Ville	GER	Implicite	3 314,00	2023
757	MONNAIE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
759	MONT DE PIETE RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
763	MONTESQUIEU BRD	Ville	GER	Implicite	515,00	2023
766	MONTPLAISIR IMP	Ville	GER	Implicite	1 808,00	2023
768	MONVOISIN AUTARD IMP	Ville	GER	Implicite	398,50	2023
773	MOULIN NOTRE DAME AVE DU	Ville	GER	Implicite	952,00	2023
774	MOUREAU PASSAGE AGRICOL	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
778	MOZART RUE	Ville	GER	Implicite	343,00	2023
780	MURIERS RUE DES	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
785	NEUVE RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2023
786	NEUVE SAINT CHARLES RUE	Ville	GER	Implicite	606,00	2023
787	NEUVILLY RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
791	NICOLAS LESCUYER RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
792	NINON VALLIN RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2023
798	NORIA DE LA IMP	Ville	GER	Implicite	578,80	2023
803	OBSERVANCE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	961,00	2023
807	OMER FRANCOIS RUE	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
811	ORIFLAMME RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
814	ORTOLANS RUE DES	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
820	PALAIS PCE DU	Ville	GER	Implicite	1 120,00	2023
821	PALAPHARNERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 040,00	2023
822	PANIER FLEURI PASSAGE DU	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
834	PASTEUR REY AVE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
836	PAUL ACHARD RUE	Ville	GER	Implicite	1 625,20	2023
848	PAUL SAIN RUE	Ville	GER	Implicite	1 120,00	2023
857	PENTE RAPIDE RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
858	PEPINIERE DE LA RUE	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
865	PERSIL RUE DU	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
869	PETIT CHANGE RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
871	PETIT LIMAS RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 835,80	2023
876	PETITE CALADE RUE	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
877	PETITE FUSTERIE RUE	Ville	GER	Implicite	880,00	2023
878	PETITE LANTERNE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
881	PETITE REILLE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
883	PETITE SAUNERIE RUE	Ville	GER	Implicite	400,00	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
886	PETIT-MARCHE RUE DU	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
892	PEYROLLERIE RUE	Ville	GER	Implicite	800,00	2023
896	PHILONARDE RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2023
897	PICPUS RUE	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
902	PIERRE CHARPENNE RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2023
912	PIERRE SEMARD AVE	Ville	GER	Implicite	952,00	2023
916	PIGNOTTE IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2023
917	PIGNOTTE PCE	Ville	GER	Implicite	398,60	2023
925	PLAN DE LUNEL	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
928	POEME DU RHONE RUE	Ville	GER	Implicite	1 440,00	2023
937	PORTAIL BIENSON RUE DU	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
938	PORTAIL BOQUIER RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2023
941	PORTAIL MATHERON RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
943	PORTE EVEQUE RUE	Ville	GER	Implicite	364,60	2023
955	PREVOT RUE DU	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
958	PRINCIPALE PCE DE LA	Ville	GER	Implicite	398,60	2023
959	PRIVADE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
963	PUITS DE LA REILLE RUE DU	Ville	GER	Implicite	570,00	2023
964	PUITS DE LA TARASQUE RUE DU	Ville	GER	Implicite	560,00	2023
974	QUINZIEME CORPS RUE DU	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
976	RACINE RUE	Ville	GER	Implicite	469,00	2023
981	RAPPE RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
983	RASPAIL BRD	Ville	GER	Implicite	3 559,00	2023
984	RATEAU RUE	Ville	GER	Implicite	1 164,60	2023
986	REINE JEANNE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 964,00	2023
988	REMPART DE LA LIGNE RUE DU	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
990	REMPART DU RHONE RUE	Ville	GER	Implicite	1 348,60	2023
992	REMPART SAINT-ROCH RUE DU	Ville	GER	Implicite	1 236,00	2023
993	REMPART ST DOMINIQUE RUE DU	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1002	RICHS CHE DES	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
1022	ROSES DES IMP	Ville	GER	Implicite	881,00	2023
1022	ROUGE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1028	SABOLY RUE	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
1029	SACRE-COEUR RUE DU	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
1032	SAINT ANDRE IMP	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
1033	SAINT ANDRE RUE	Ville	GER	Implicite	423,00	2023
1035	SAINT ANTOINE IMP	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
1036	SAINT ANTOINE RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1039	SAINT CHRISTOPHE CHE DE	Ville	GER	Implicite	286,00	2023
1040	SAINT CHRISTOPHE RUE	Ville	GER	Implicite	1 628,00	2023
1046	SAINT JOSEPH PLACE	Ville	GER	Implicite	317,20	2023
1047	SAINT JOSEPH RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2023
1050	SAINT PIERRE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1052	SAINT SEBASTIEN RUE	Ville	GER	Implicite	397,20	2023
1053	SAINT THOMAS D'AQUIN RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
1060	SAINTE CATHERINE RUE	Ville	GER	Implicite	1 023,40	2023
1062	SAINTE PERPETUE RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2023
1064	SAINTE THERESE IMP	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1076	SAINT-PAUL IMP	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1079	SALUCES RUE	Ville	GER	Implicite	1 030,00	2023
1083	SANTOESTELLO RUE	Ville	GER	Implicite	1 520,00	2023
1084	SARAILLERIE RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
734	MIDI BRD DU	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
1103	SIXTE ISNARD BRD	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
1109	SORGUETTE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1116	SUREAU RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER						
Ville d'Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
1119	TAMARIS CHEMIN DES	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
1121	TAPY CHE DE LA	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
1126	TAULIGNAN RUE DE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1127	TEINTURIERS DES RUE	Ville	GER	Implicite	2 155,80	2023
1130	TERRE NOIRE RUE	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1142	TORTOSA RUE DE	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
1150	TREMOULET RUE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1152	TRILLADE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	6 394,60	2023
1153	TRILLADETTE IMP	Ville	GER	Implicite	812,00	2023
1155	TROIS CARREAUX RUE DES	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1157	TROIS FAUCONS DES RUE	Ville	GER	Implicite	560,00	2023
1160	TROIS PILATS RUE DES	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
1166	TURIN IMP	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1167	UNIVERSELLE RUE	Ville	GER	Implicite	1 140,00	2023
1169	VELOUTERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 121,00	2023
1174	VERNET HORACE RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2023
1178	VICE LEGAT RUE DU	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
1181	VICTOR HUGO RUE	Ville	GER	Implicite	776,60	2023
1182	VIEILLE JUIVERIE RUE	Ville	GER	Implicite	877,20	2023
1184	VIENEUVE RUE	Ville	GER	Implicite	343,00	2023
1186	VIEUX SEXTIER RUE DU	Ville	GER	Implicite	880,00	2023
1188	VILLAS RUE DES	Ville	GER	Implicite	309,00	2023
1189	VILLAS ST MICHEL IMP	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1193	VIOLETTE AVE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 299,80	2023
1195	VIOLETTE RUE	Ville	GER	Implicite	1 190,60	2023
1199	XAVIER DE FOURVIERES RUE	Ville	GER	Implicite	721,00	2023
1200	XAVIER FORTIA D'URBAN RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
1206	SAINT DOMINIQUE BRD	Ville	GER	Implicite	480,00	2023
1213	PETITE CREMADE RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
1224	YERSIN ALEXANDRE RUE	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
603	JULES FERRY BRD	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
1263	SCOTTO VINCENT RUE	Ville	GER	Implicite	618,00	2023
1267	VERLAINE IMPASSE	Ville	GER	Implicite	400,00	2023
1269	AUTRAND RUE AIME	Ville	GER	Implicite	206,00	2023
1270	LABANDE RUE LEON HONORE	Ville	GER	Implicite	618,00	2023
1272	GIRARD AVENUE JOSEPH	Ville	GER	Implicite	515,00	2023
1282	MOURET IMP HENRI	Ville	GER	Implicite	412,00	2023
1283	CITES LOUIS GROS RUE DES	Ville	GER	Implicite	3 064,00	2023
1284	REYNIER IMP MARCEL	Ville	GER	Implicite	240,00	2023
1288	COUPO SANTO PLACE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 120,00	2023
1289	ILES D'OR RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 355,80	2023
1300	SABOLY PLACE NICOLAS	Ville	GER	Implicite	640,00	2023
1301	CORDERIE RUE	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
1321	GERARD PHILIPPE RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1323	ARGENTIERE RUE	Ville	GER	Implicite	158,60	2023
1324	VICTOR POUCEL RUE	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1327	GASTIN PLACE LOUIS	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1330	LAURIER IMPASSE DU	Ville	GER	Implicite	103,00	2023
1331	MORIERE RTE DE MFT	Ville	GER	Implicite	5 823,60	2023
1334	L'EPEAUTRE IMPASSE DE	Ville	GER	Implicite	160,00	2023
1337	PRINCIPALE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	880,00	2023
1355	RUE FRANZ SCHUBERT	Ville	GER	Implicite	80,00	2023
1362	PCE ROBERT BAILLY	Ville	GER	Implicite	320,00	2023
218B	ROCADE CHARLES DE GAULLE (bretelles)	Ville	GER	Implicite	10 259,60	2023

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme G4 différé Reconstruction éclairage public

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
11	AIGARDEN RUE DE L'	Ville	Dif	Implicite	7 014,11	2022
103	BARAILLERIE RUE	Ville	Dif	Implicite	7 998,10	2022
143	BON PASTEUR RUE DU	Ville	Dif	Implicite	6 234,77	2022
165	BUFFON RUE	Ville	Dif	Implicite	9 597,72	2022
227	CHATEAUBRIAND RUE	Ville	Dif	Implicite	3 199,24	2022
313	DE L'OFFICIALITE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 558,69	2022
406	FLOUR JULES RUE	Ville	Dif	Implicite	5 455,42	2022
421	FRANCHE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 999,05	2022
487	GRANDE MONNAIE RUE	Ville	Dif	Implicite	6 234,77	2022
681	MANIVET PAUL RUE	Ville	Dif	Implicite	7 198,29	2022
738	MIJEANNE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 676,08	2022
819	PAILLASSERIE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 999,05	2022
936	PONT TROUCAS RUE DU	Ville	Dif	Implicite	5 839,99	2022
1019	ROQUETTE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 798,86	2022
1020	ROQUILLE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 798,86	2022
1037	SAINT BERNARD RUE	Ville	Dif	Implicite	7 198,29	2022
1094	SEPTIEME GENIE AVE DU	Ville	Dif	Implicite	1 648,22	2022
1097	SEVERINE RUE	Ville	Dif	Implicite	2 456,98	2022
1214	PETITE FRANCHE RUE DE LA	Ville	Dif	Implicite	3 199,24	2022
934	PONT RUE DU	Ville	Dif	Implicite	1 297,60	2022

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme GER

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
16	ALBERTO MAGNELLI RUE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
25	ALFRED CASILE IMP.	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
29	ALIZARINE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
33	ALPHONSE GENT RUE	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
57	ANGLJC GRIMOARD RUE	Ville	GER	Implicite	2 061,80	2022
71	ARCUSSI BRD	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
74	ARMANDE IMP DE L'	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
75	ARMENIE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
89	AUGUSTE DUMAS RUE	Ville	GER	Implicite	3 965,00	2022
95	AZALAIS MARTIN RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
99	BALANCE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
107	ROUTE DE L'ISLON	Ville	GER	Implicite	5 868,20	2022
115	BEAU SEJOUR BRD	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
122	BENEZET BRUNEAU RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
128	BERNARD HUGUES PCE	Ville	GER	Implicite	3 172,00	2022
133	BIRET NOEL RUE	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
140	BLUM RUE LEON	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
153	BOUQUERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
175	CAMELIAS DES RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
201	CASTELLIAU RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
222	CHARLOUN - RIEU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
244	CLAUDE BOITELLET RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
249	CLEMENT BRUN IMP.	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
257	CLOVIS HUGUES RUE	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
258	COLCHESTER AVE DE	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
303	CROZEAU RUE DU	Ville	GER	Implicite	2 537,60	2022
306	DAHLIAS RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
387	FAVOT IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
399	FLANEURS RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
427	FRANCOIS JOUVE RUE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
451	GAMBETTA IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
460	GAZELLE IMP DE LA	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
480	GOUJON JEAN ALLEE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
481	GOUNOD IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
483	GRAND PARADIS PLACE DU	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
502	GUILLABERT IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
515	HENRI BARJAVEL RUE	Ville	GER	Implicite	3 172,00	2022

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme GER

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
523	HENRI ROLLAND RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
533	ILE PIOT CH. DE L'	Ville	GER	Implicite	5 551,00	2022
557	JEAN CADARD RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
568	JEAN ROSTAND RUE	Ville	GER	Implicite	2 696,20	2022
609	JUMEAUX DES IMP	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
614	LABOUREUR DU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
618	LANGE IMP.	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
625	LAURIER D'ARLES RUE DU	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
629	LAVOISIER RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
639	LIBERATION RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
660	LOUIS CARPENTRAS IMP.	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
678	MAILLOL ARISTIDE ALLEE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
679	MALEBRANCHE RUE NICOLAS DE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
684	MARC CHAGALL RUE	Ville	GER	Implicite	1 744,60	2022
701	MARJOLAINE IMP.DE LA	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
709	MASSENA IMP	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
742	MIREILLE IMP	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
743	MISSAK MANOUCHIAN RUE	Ville	GER	Implicite	3 013,40	2022
751	MOLINAS IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
752	MOLINO IMP	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
768	MONVOISIN AUTARD IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
781	MUSETTE IMP	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
783	NATIONALE RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
790	NICOLAS IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
827	PAQUERETTES RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
847	PAUL RAMADIER RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
850	PAVILLONS IMP. DES	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
853	PEILLARD RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
854	PEINTRES PAROCEL RUE DES	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
863	PERRET IMP	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
893	PHENIX RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
929	POINCARRE RAYMOND RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
948	POUZARAQUE RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
963	PUITS DE LA REILLE RUE DU	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
965	PUITS DES ALLEMANDS RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
1009	ROGER SALENGRO BRD	Ville	GER	Implicite	2 854,80	2022
1021	ROSES DES IMP	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
1026	RUDE FRANCOIS ALLEE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1043	SAINT GUILLAUME RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1070	SAINT-JEAN IMP	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
1074	SAINT-MICHEL CHEMIN	Ville	GER	Implicite	3 330,06	2022
1116	SUREAU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
1132	THEODORE KING RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1134	THOULOUSE RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1141	TORT RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1189	VILLAS ST MICHEL IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1191	VINCENT AURIOL RUE	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1196	VOLTAIRE RUE	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1204	ZANI RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
1258	MOLIAT GUILLAUME RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1264	FALLA RUE DE	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
1284	REYNIER IMP MARCEL	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1302	CLOS NOTRE DAME ALLEE DU	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
1303	MIEL JOLI CHEMIN DU	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
1305	PECHERAIES CHEMIN DES	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1327	GASTIN PLACE LOUIS	Ville	GER	Implicite	317,20	2022

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2021

Travaux réalisés sur l'année 2021 sur programme G4 différé

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
282	CORNUE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 783,95	2021
1038	SAINT CHARLES RUE	Ville	Dif	Implicite	19 601,10	2021
1210	ANTOINE PINAY ALL	Ville	Dif	Implicite	3 107,32	2021
90	AUGUSTE ROURE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 149,80	2021
97	BACHAGA BOUALEM PL.	Ville	Dif	Implicite	1 185,61	2021
252	CLOS DES TRAMS IMP.	Ville	Dif	Implicite	1 149,80	2021
329	DOCTEUR PANSIER RUE DU	Ville	Dif	Implicite	2 371,21	2021
345	EDMOND DELTEIL RUE	Ville	Dif	Implicite	4 489,84	2021
348	EDMOND ROSTAND RUE	Ville	Dif	Implicite	1 905,03	2021
442	GABRIEL PIERNE BRD	Ville	Dif	Implicite	592,80	2021
494	GREGOIRE 11 AVE	Ville	Dif	Implicite	6 631,12	2021
510	HALAGE CH.DE	Ville	Dif	Implicite	3 848,43	2021
540	ITALIENS AV.DES	Ville	Dif	Implicite	5 614,09	2021
740	MILLERAND ALEXANDRE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 489,84	2021
1290	ROUY IMPASSE DU LOTISSEMENT	Ville	Dif	Implicite	3 449,39	2021
14	ALBERT CONIL RUE	Ville	Dif	Implicite	6 067,68	2021
135	BLANCHE-FLEUR RUE	Ville	Dif	Implicite	7 696,87	2021
182	CANCANIERES RUE DES	Ville	Dif	Implicite	3 232,61	2021
338	DUC DE CUMBERLAND RUE	Ville	Dif	Implicite	6 067,68	2021
439	FROISSART RUE	Ville	Dif	Implicite	1 924,22	2021
545	JACQUES STUART RUE	Ville	Dif	Implicite	10 348,98	2021
722	MAURILLE-DE-SOMBREUIL RUE	Ville	Dif	Implicite	1 516,92	2021
825	PAPILLONS BLEUS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	6 573,32	2021
1198	WILLIAM ET CATH BOOTH RUE	Ville	Dif	Implicite	4 550,76	2021
1335	FABRE D'EGLANTINE RUE	Ville	Dif	Implicite	510,76	2021
15	ALBERT DELSUC BRD	Ville	Dif	Implicite	2 295,68	2021

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2020

Travaux réalisés sur l'année 2020 sur programme G4 différé

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
31	ALLIANCE IMP	Ville	Dif	implicite	6 018,00	2020
908	PIERRE DEVOLUY RUE	Ville	Dif	implicite	2 674,90	2020
1366	ROCADE CHARLES DE GAULLE (Sud-NR)	Ville	NR	implicite	110 426,94	2020
1367	ROCADE CHARLES DE GAULLE (Sud-SR)	Ville	NR	implicite		2020

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2019

Travaux réalisés sur l'année 2019 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2019						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D’AVIGNON 2018

Travaux réalisés sur l'année 2018 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2018						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2017

Travaux réalisés sur l'année 2017 sur programme G4 différé

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
199 GC	CASSIN RUE RENE	Ville	Diff	Implicite	2 758,58	2017
647	LIMBERT BRD	Ville	NR	Implicite	3 419,30	2017

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2016

Travaux réalisés sur l'année 2016 sur programme G4 différé

Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
62	ANNIBAL CECCANO RUE	Ville	Dif	Implicite	21 574,63	2016
98	BAINS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	3 849,79	2016
172 GC	CAMARGUE PCE DE LA GC	Ville	Dif	Implicite	4 373,46	2016
192	CARNOT RUE	Ville	Dif	Implicite	1 182,25	2016
215 GC	CHANTS PALUSTRES AVE DES GC	Ville	Dif	Implicite	4 511,45	2016
263	COLLEGE DU ROURE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 849,79	2016
285	COSTEBELLE PCE	Ville	Dif	Implicite	67,00	2016
351	EISENHOWER AVE GC AERIEN	Ville	Dif	Implicite	1 467,37	2016
352	ELIE DE TALLEYRAND RUE	Ville	Dif	Implicite	9 391,53	2016
357	EMILE ESPERANDIEU RUE	Ville	Dif	Implicite	656,49	2016
415	FORET RUE DE LA	Ville	Dif	Implicite	6 135,00	2016
418	FOURBISSEURS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	16 775,43	2016
531	HUGUES DE SADE RUE	Ville	Dif	Implicite	6 344,40	2016
542	JACOB RUE	Ville	Dif	Implicite	1 744,73	2016
554	JEAN ANDRE BORDE RUE Accès garage	Ville	Dif	Implicite	5 723,09	2016
558	JEAN CATELAS RUE	Ville	Dif	Implicite	23 315,58	2016
647	LIMBERT BRD PORTE	Ville	Dif	Implicite	2 580,70	2016
727 GC	MEINAJARIES CHE DES GC	Ville	Dif	Implicite	4 485,68	2016
761	MONT VENTOUX RUE DU	Ville	Dif	Implicite	24 872,71	2016
811	ORIFLAMME RUE DE L'	Ville	Dif	Implicite	5 428,65	2016
822	PANIER FLEURI PASSAGE DU	Ville	Dif	Implicite	589,49	2016
869	PETIT CHANGE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 312,98	2016
1042	SAINT GENIES SQUARE DE	Ville	Dif	Implicite	10 221,81	2016
1060	SAINTE CATHERINE RUE COMPLEMENT	Ville	DIF	Implicite	559,24	2016
1062	SAINTE PERPETUE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 875,46	2016
1068	SAINT-GENIEST CHE DE	Ville	Dif	Implicite	9 660,27	2016
1109	SORGUETTE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 422,46	2016
1195	VIOLETTE RUE RAJOUT DE 2 FOYERS	Ville	Dif	Implicite	2 059,11	2016
1261	GIRARD SIMONE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 794,44	2016

SUIVI PHASE DIFFEREE 2015 – VILLE D'AVIGNON

AVIGNON (RUES RECONSTRUITES)

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
38RIS	AMANDIER CHE DE L'MFT (RIS)	16/11/2015					945,90	
62R	ANNIBAL CECCANO (Réseau façade)	16/11/2015					22 206,00	
0198	CASSAN RUE	18/12/2015						56,79
232R	CHEVALIER DE FOLARD AVE (Réseau)	03/09/2015					2 277,45	
0328	DOCTEUR GEOFFROY RUE DU	05/08/2015				16 474,00	2 335,17	
0364	EREVAN RUE D'	"avoir" d'une opération imputée en phases 2 ET 3				-14 800,63		-170,36
0377	ETOILES RUE DES	"avoir" d'une étude imputée en phase 1 ET en phase 2						-227,15
1314M	FOLIE CHEMIN DE LA MODIF	18/12/2015				-92 243,34		
0429	FRANCOIS MAURIAC AVE	16/10/2015				28 852,38		7,33
0450	GAMBETTA BRD	18/12/2015						283,94
488-2	GRANGE D'OREL RUE DE LA	18/12/2015				682,22	1 879,91	
529D	HORLOGE PLACE (dépose définitive)	28/10/2015				67,00		
625D	LAURIER D'ARLES RUE DU	05/10/2015				1 065,15		
1293M	MARIN TRAVERSE DU PÈRE MODIF	18/12/2015				-92 725,26		
685R	MARC SANGNIER RUE	18/12/2015					31 031,17	
705-2	MARSEILLE ROUTE DE (2ème partie)	18/12/2015					131 728,66	
767-2	RUE MARTIN LUTHER KING (ajout)	18/12/2015				379,99		
801R2	NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS	06/08/2014					631,76	
877SA	PETITE FUSTERIE RUE (Saint Agricola)	08/10/2015				5 088,63		
820-2	PALAIS PCE DU (complément)	08/10/2015				69 044,48		
986-2	REINE JEANNE RUE DE LA (2ème partie)	28/10/2015				21 831,00	1 356,96	577,34
986-3	REINE JEANNE RUE DE LA (Carrefour)	02/11/2015				3 801,84		
990R	REMPART DU RHONE RUE	19/10/2015					4 000,61	
1068R	SAINT-GENIEST CHE DE (Réseau)	20/11/2015					1 956,46	
1281	SOUVENIR FRANCAIS ESPLANADE DU	18/12/2015						9,46
	régularisation erreurs matérielles sur les PV 1, 2 et 3 (détails ci-dessus)						17 962,63	539,48
						-34 519,91	200 350,05	1 076,83

travaux	-34 519,91
câbles/réseaux	200 350,05
études EXE	1 076,83
mise en valeur	153 235,98
Couronnes gds mâts	42 728,40
total Dif 2015	362 871,35

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON

Type de travaux							
			Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	Couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
Budget contrat en € HT			167 000,69	167 000,69			
Année		Montant €	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
2015		-78 816,26	-1 944,46				-76 871,80
2016		12 428,14	12 428,14				
2017		113 840,58	113 840,58				
2018		10 769,00	10 769,00				
2019		0,00	0,00				
2020		31 429,51	31 429,51				
2021		0,00	0,00				
2022		22 204,00	0,00				22 204,00
2023		0,00	0,00				0,00
2024		0,00	0,00				0,00
2025		0,00					
2026		0,00					
2027		0,00					
Totaux:			111 854,97	166 522,77	0,00	0,00	-54 667,80

			Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
Total réalisation HT:			111 854,97	166 522,77	0,00	0,00	-54 667,80
Recette ht							
Solde restant à disposition ht:			55 145,72	477,92	0,00	0,00	54 667,80

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2024

Travaux réalisés sur l'année 2024 sur programme G4 différé						
Grand Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2024						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme G4 différé
Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2023						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2023

Travaux réalisés sur l'année 2023 sur programme GER						
Grand Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2023						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme G4 différé

Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2022						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme GER

Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
124	BEREGOVY PIERRE AVE	GA	GER	Implicite	5075,2	2022
145	BON VENT RUE DU	GA	GER	Implicite	3172	2022
294	CRISTOLE CHE DE LA	GA	GER	Implicite	1427,4	2022
482	GRAND GIGOGNAN RUE	GA	GER	Implicite	3647,8	2022
584	JEAN-MARIE TJIBAOU RUE	GA	GER	Implicite	3489,2	2022
775	MOURELET RUE DU	GA	GER	Implicite	1744,6	2022
885	PETIT-GIGOGNAN RUE DE	GA	GER	Implicite	2696,2	2022
972	QUATRE GENDARMES D'OUVEA R.DES	GA	GER	Implicite	951,6	2022

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2021

Travaux réalisés sur l'année 2021 sur programme G4 différé

Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagemen t
Aucune réalisation sur l'exercice 2021						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2020

Travaux réalisés sur l'année 2020 sur programme G4 différé

Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
1207	MARCOU DELANGLADE AVE	GA	Dif	GA	6 392,44	2020
1208	CHARLES VALENTE AVE	GA	Dif	GA	10 121,37	2020
1315	SEGHERS RUE PIERRE	GA	Dif	GA	14 915,70	2020

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2019

Travaux réalisés sur l'année 2019 sur programme G4 différé						
Grand Avignon						
clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2019						

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2018

Travaux réalisés sur l'année 2018 sur programme G4 différé
Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
475	Avenue de la Gloriette	GA	Dif	02/05/17	10 768,67	2018

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2017

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
375	ETANG RUE DE L'	GA	Dif	02/05/17	12 725,71	2017
412	Fontcouverte AVE DE	GA	Dif	02/05/17	73 663,20	2017
813	ORME FOURCHU AVE DE L'	GA	Dif	02/05/17	14 807,75	2017
1056	SAINT-CHAMAND AVE DE	GA	Dif	06/05/15	12 643,92	2017

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2016

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
239	CINQ CANTONS AVE DES	GA	Dif	ok	12 428,14	2016

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE 2015 – GRAND AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves
0447	GALLIAS RUE	18/12/2015			
412M	Fontcouverte Ave de Modif	18/12/2015			

ANNEXE 5 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 1

AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	3 236 439,20	313 426,60	45 988,33
		armoires	618 532,69		
		travaux	3 236 439,20		
		câbles/réseaux	313 426,60		
		mise en valeur	493 516,87		
		illuminations	109 570,48		
		études EXE	46 120,83		
		frais offre	113 236,89		
		total Phase 1	4 930 843,56		

ANNEXE 6 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 1

GRAND AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	272 076,80	3 615,89	3 975,13
		armoires	49 140,77		
		travaux	272 076,80		
		câbles/réseaux	3 615,89		
		mise en valeur	sans objet		
		illuminations	sans objet		
		études EXE	3 975,13		
		frais offre	7 728,58		
		total Phase 1	336 537,17		

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés

POSTE G4

ANNEXE 7 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 2

AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	2 720 503,88	81 388,20	36 381,81
		travaux	2 720 503,88		
		câbles/réseaux	81 388,20		
		études EXE	36 381,81		
		frais offre	66 713,06		
		total Phase 2	2 904 986,95		

ANNEXE 8 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 2

GRAND AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
0311	DAVID-NEEL ALEXANDRA RUE	09/07/2014	1 719,96	0,00	37,86
0333	DOUZIEME RGT DE ZOUAVES RUE DU	13/05/2014	10 299,66	0,00	179,83
0390	FENAISSONS ALLEE DES	08/10/2014	8 290,63	0,00	66,25
1227	HENRI DU BELLET RUE DU CAPITAINE DE VAISSEAU	24/09/2014	6 164,14	0,00	123,04
584R	JEAN-MARIE TJIBAOU RUE (Réseau EP)	10/10/2014		1 550,72	
1293M	MARIN TRAVEPCA DU PERE MODIF	13/10/2014	14 244,65		
0732	MICHEL CAZAUX RUE	22/07/2014	3 039,93	0,00	75,72
0987	REMOULEURS ROUTE DES	02/07/2014	18 221,79	0,00	198,76
1065	SAINTE GENEVIEVE AVENUE	10/10/2014	24 396,93	0,00	227,15
1111	SOUSPIROUS AVE DES	07/10/2014	51 171,75	0,00	851,81
		sous-totaux	137 549,44	1 550,72	1 760,42
		travaux	137 549,44		
		câbles/réseaux	1 550,72		
		études EXE	1 760,42		
		frais offre	66 713,06		
		total Phase 1	207 573,64		

ANNEXE FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 3

AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
	307 Rues (re)construites					1 958 826,23	209 052,89	28 064,60

travaux:	1 958 826,23
câbles/réseaux:	209 052,89
illuminations:	109 570,48
études EXE:	28 064,60
frais offre:	54 190,65
total Phase 3:	2 359 704,85

GRAND AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
	20 Rues (re)construites					187 469,91	37 193,79	2 174,20

travaux:	187 469,91
câbles/réseaux:	37 193,79
études EXE:	2 174,20
frais offre ph 2:	-61 946,13
frais offre ph 3:	3 875,75
total Phase 3:	168 767,52

Conformément au marché, sous-traitance PME, pour un montant total en € HT de : **2 124 842,82**

Entreprise SIBINSKI	514 472,42
Entreprise SEBASTIEN NICOLAS	408 002,00
Entreprise LLOPIS FABIEN / FAB.ELEC (NA)	9 419,00
CEC SOCIETE D'EXPLOITATION CORBELLI	9 218,00
BLACHERE ILLUMINATION	722 838,94
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUERPEL	157 333,46
AEC	7 745,00
Entreprise BLASCO	295 814,00

2 124 842,82

ACTIVITÉ

Travaux préfinancés


POSTE G4

TRAVAUX PREFINANCES

Mise en lumière

100% des mises en lumière réalisées en 2013

Montant marché en € HT: 493 536.04



Compte rendu de l'exécution du poste illuminations

Analyse de l'exécution du programme :

	N° de pièce	
Crédit année 1 :		175 023,64
Avenant année 1 :		94 667,50
Travaux exécutés en 2013 :		262 421,76
Report année 1 :		7 269,38
Avoir sur année 1	5001765618	-7 269,38
Solde année 1:		0,00
Crédit année 2 :		175 023,64
Avenant année 2 :		94 667,50
Travaux exécutés en 2014 :		261 825,80
Report année 2 :		7 865,34
Avoir sur année 2	5001765624	-7 865,34
Solde année 2:		0,00
Crédit année 3 :		175 023,64
Avenant année 3 :		94 667,50
Travaux exécutés en 2015 :		275 786,53
Report 2016 :		-6 095,39
Facture sur année 3	5002089347	6095,39
Solde année 3:		0,00
Crédit année 4 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2016-2017:		72 415,16
Travaux exécutés en 2016 :		254 079,43
Solde année 4:		0,00
Crédit année 5 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2017-2018:		95 000
Travaux exécutés en 2017 :		264 453,43
Facture sur année 5	8790000427	82 789,16
Solde année 5:		0,00
Crédit année 6 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2018-2019 :		95 000
Travaux exécutés en 2018 :		276 664,27
Solde année 6:		0,00
Crédit année 7 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2019-2020 :		95 000
Travaux exécutés en 2019 :		276 664,27
Solde année 7:		0,00
Crédit année 8 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2020-2021 :		95 000
Travaux exécutés en 2020 :		276 664,27
Solde année 8:		0,00
Crédit année 9 :		181 664,27
Avenant N° 2 année 2021-2022 :		95 000
Travaux exécutés en 2021 :		276 664,27
Solde année 9:		0,00

Compte rendu de l'exécution du poste illuminations

Crédit année 10 :	181664,27
Travaux exécutés en	
2022 :	181664,27
Solde année 10:	0,00
Crédit année 11 :	186969,06
Travaux exécutés en	
2023 :	186969,06
Solde année 11:	0,00
Crédit année 12 :	
Travaux exécutés en	
2024 :	186969,06
Solde année 12:	0,00
Crédit année 13 :	
Travaux exécutés en	
2025 :	186969,06
Solde année 13: A venir	-186 969,06
Crédit année 14 :	
Travaux exécutés en	
2026 :	186969,06
Solde année 14: A venir	-186 969,06
Reste a réaliser € HT	373 938,12

ACTIVITE

Illuminations festives

Projet d'illuminations saisons 2024-2025
Partenariat Public Privé Ville d'Avignon
Illuminations de fin d'année Saison 2024-2025
Année 12

Affaire suivie par, Loïc Jeannin

Avignon le 15/11/2024

Lieux	Support	Q prévu	Q réalisé	ecart	P.U Fournitures	P.U Pose	Coût Four- nitures	Coût Pose	Coût Total
Hôtel de Ville	Façade	1,00	1,00	0,00	337,50	5 525,30	337,50	5 525,30	
Place de l'horloge	Plafond	1,00	1,00	0,00	2 497,50	8 294,32	2 497,50	8 294,32	
Place de l'horloge	Arbres	140,00	140,00	0,00	8,40	65,23	1 176,00	9 132,20	
Place de l'horloge	Arbres	14,00	14,00	0,00	91,00	357,85	1 274,00	5 009,92	
							5 285,00	27 961,74	33 246,74
Avignon Intramuros									
Cours Jean Jaures	Candélabres	20,00	20,00	0,00	13,50	157,32	270,00	3 146,40	
Avenue de la République	Filins	9,00	9,00	0,00	37,80	2 210,12	340,20	19 891,08	
Place Crillon	Arbres	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Place Crillon	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	1 657,59	47,25	1 657,59	
Parvis saint agricole	Arbres	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Place des Corps Saints	Arbres	4,00	4,00	0,00	33,75	653,20	135,00	2 612,80	
Place des Corps Saints	Sol fontaine	1,00	1,00	0,00	47,25	839,02	47,25	839,02	
Place des Celestins	Candélabres	1,00	1,00	0,00	13,50	157,32	13,50	157,32	
Rue Guillaume Puy	Arbres	4,00	4,00	0,00	33,75	326,15	135,00	1 304,60	
Marchand/ Favard	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Place saint didier	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Place Pie	Candélabres	6,00	6,00	0,00	13,50	157,32	81,00	943,92	
Place Pie	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	10 498,07	47,25	10 498,07	
Place saint jean le vieux	Arbres	0,00	0,00	0,00	33,75	653,20	0,00	0,00	
Rue Bonneterie	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Pce Carnot	Sol	3,00	3,00	0,00	47,25	1 105,06	141,75	3 315,18	
Rue des teinturiers	Filins	4,00	4,00	0,00	33,75	653,20	135,00	2 612,80	
Place des Carmes	Kiosque	4,00	4,00	0,00	20,25	521,84	81,00	2 087,36	
Place des Carmes	Candélabres	3,00	3,00	0,00	13,50	157,32	40,50	471,96	
Place des Carmes	Arbres	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Place Saint Didier arbre baretta	Arbres	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Rue bonneterie derriere les Halles 3 p	Arbres	3,00	3,00	0,00	33,75	653,20	101,25	1 959,60	
Pce Jerusalem 2 platanes	Arbres	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Rue De l'attre de tassigny	Candélabres	2,00	2,00	0,00	13,50	157,32	27,00	314,64	
Rue thier	Arbres	2,00	2,00	0,00	33,75	326,15	67,50	652,30	
Rue thier	Traversée	1,00	1,00	0,00	13,50	419,51	13,50	419,51	
Place Costebelle	Arbres	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Rue Carnot /CUBANITO	Arbres	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Pce Matheron	Sol	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
							2 250,45	63 836,39	66 086,84
Portes									
République	Façade	1,00	1,00	0,00	2 888,03	0,00	2 888,03	0,00	
Saint Lazare	Candélabres	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Saint Michel	Candélabres	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Tour Pont de l'europe	Candélabres	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Porte de l'ouille	Façade	1,00	1,00	0,00	4 792,50	1 268,77	4 792,50	1 268,77	
							12 682,28	2 247,22	14 929,50
Avignon Extramuros									
Route de Marseille	Candélabres	12,00	12,00	0,00	422,55	157,32	5 070,60	1 887,84	
Route de Marseille	Traversée	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Saint Ruf	Candélabres	10,00	10,00	0,00	287,55	157,32	2 875,50	1 573,20	
Notre dame	Candélabres	4,00	4,00	0,00	287,55	157,32	1 150,20	629,28	
Monclar	Candélabres	4,00	4,00	0,00	422,55	157,32	1 690,20	629,28	
Monclar	Traversée	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Route de Morières	Candélabres	8,00	8,00	0,00	422,55	157,32	3 380,40	1 258,56	
Route de Morières	Traversée	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Route de Lyon	Candélabres	3,00	3,00	0,00	422,55	157,32	1 267,65	471,96	
C. C. Pont des Deux-Eaux	Candélabres	4,00	4,00	0,00	375,60	157,32	1 502,40	629,28	
							19 699,05	8 337,93	28 036,98
Monfavet									
Cours Cardinal Bertrand	Candélabres	12,00	12,00	0,00	422,55	157,32	5 070,60	1 887,84	
Ave des Vertes Rives	Candélabres	8,00	8,00	0,00	422,55	157,32	3 380,40	1 258,56	
Place de l'église	Candélabres	9,00	9,00	0,00	416,86	157,32	3 751,76	1 415,88	
Place de l'église	SOL	1,00	1,00	0,00	6 629,85	1 105,06	6 629,85	1 105,06	
Les entrées	Traversée	4,00	4,00	0,00	1 545,75	419,51	6 183,00	1 678,04	
							25 015,61	4 198,98	29 214,59
ENTREES DES RUES COMMERNCANTES									
Rue Baroncelli	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Vernet	Traversée	3,00	3,00	0,00	862,65	326,15	2 587,95	978,45	
Rue Petite Fusterie	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Saint Agricole	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue des trois Faucons	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Henry Fabre	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue de Marchand	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Place du change	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Vernet victor Hugo	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Bonneterie / halles	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue du vieux sextier	Traversée	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
							11 214,45	4 239,95	15 454,40

Prévu au contrat		Projet illuminations 2024-2025	
Cout de fourniture prévu au contrat € HT	79 687,62	Cout de fourniture € HT	76 146,85
Cout de Pose prévu au contrat € HT	107 281,44	Cout de Pose € HT	110 822,21
Cout total fourniture et pose prévu au contrat € HT	186 969,06	Cout fourniture et pose € HT	186 969,06
Avenant N° 2	0,00		
Cout total fourniture et pose prévu au contrat y compris Avenant N°2 € HT	186 969,06		186 969,06
T.V.A 20%	37 393,81	T.V.A 20%	37 393,81
Cout total fourniture et pose prévu au contrat € TTC	224 362,87	Cout fourniture et pose € TTC	224 362,87



03

BILAN

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat de
l'exercice

Certificat de calcul

Annexes 1



BILAN

Bilan actif

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	11 317 763	8 769 218	2 548 545	3 398 972
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	11 317 763	8 769 218	2 548 545	3 398 972
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	0	0	0	0
Total Actif Immobilisé (II)	11 317 763	8 769 218	2 548 545	3 398 972
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	561 277	0	561 277	502 195
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	561 277	0	561 277	502 195
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	448 679	0	448 679	1 130 828
Autres créances	692 279	0	692 279	96 859
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	1 140 958	0	1 140 958	1 227 687
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 048 796	0	1 048 796	513 887
TOTAL Disponibilités	1 048 796	0	1 048 796	513 887
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	2 751 031	0	2 751 031	2 243 768
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	14 068 794	8 769 218	5 299 576	5 642 740

BILAN

Bilan passif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 75 000	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves	0	0
Report à nouveau	260 094	238 053
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 499	29 767
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	391 593	342 819
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0	0
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 537 534	3 296 608
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières	2 537 534	3 296 608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 159 162	471 651
Dettes fiscales et sociales	206 968	231 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
TOTAL Dettes d'exploitation	2 366 129	702 678
Produits constatés d'avance	4 320	1 300 635
TOTAL DETTES (IV)	4 907 983	5 299 921
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	5 299 576	5 642 740

BILAN

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	3 577 811	0	3 577 811	1 772 900
Chiffres d'affaires nets	3 577 811	0	3 577 811	1 772 900
Production stockée			59 082	59 082
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			4 258	2 529
Total des produits d'exploitation (I)			3 641 151	1 834 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			2 552 096	734 351
Impôts, taxes et versements assimilés			4 256	4 223
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	Dotations aux amortissements sur immobilisations		850 427	850 427
	Dotations aux provisions		0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		0	0
Autres charges			0	3
Total des charges d'exploitation (II)			3 406 779	1 589 003
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			234 372	245 508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			3 777	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			3 777	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			162 817	205 819
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			162 817	205 819
RÉSULTAT FINANCIER			-159 040	-205 819
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			75 332	39 689

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	18 833	9 922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 644 928	1 834 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 588 429	1 804 744
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	56 499	29 767

BILAN

Certificat de calcul



CERTIFICAT DE CALCUL DU RATIO DE LEVIER FINANCIER

A : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse
A l'attention de Jérôme Jaume, Isabelle Desenclos, Axel Pirrottina
Place Estrangin Pastré – BP 108
13 254 Marseille Cédex 06 - FRANCE

Objet : Avignon – Contrat de Crédit en date du 28 août 2012 (le "**Contrat**").

Certificat établi pour servir et valoir ce que de droit

Messieurs,

1. Nous nous référons au Contrat. Les termes définis dans le Contrat auront, sauf indication contraire expresse, le même sens dans le présent certificat.
2. Le calcul du Ratio de Levier Financier ressort à 97.13 %, suivant la formule effectuée comme le rapport $A / (A+B)$:
 - A désigne l'Encours du Crédit Dailly au 31 décembre 2024
 - B désigne le montant des Apport en Fonds Propres Autorisés mis à la disposition de l'Emprunteur et non remboursés ou distribués au 31 décembre 2024
3. Les montants respectifs des agrégats servant au calcul du Ratio de Levier Financier sont de :
 - A : 2 537 534 €
 - B : 75 000 €

Laurent MERIC,


Président de la société Lumières du Grand Avignon

A Lyon, le 06 février 2025




- Annexe 1

Annexe aux comptes annuels





**DEVELOPPEMENT
DURABLE**
Optimisation du poste de
fonctionnement
Note sur la pollution
lumineuse



VILLE EN TRANSITION

La ville en transition


Réalisations 2024

Liste des actions significatives réalisées en 2024 :

- Dans le cadre de l'enveloppe GER nous avons mis en place des lampes de technologie LED en lieu et place des lampes à décharge sur 2500 luminaires reconstruits dans le cadre des investissements initiaux.
- Rénovation des luminaires dans 12 rues selon le programme différé

Planification 2025

- Mise en place de Kit Rétrofit Led sur les lanternes forte puissance le cadre du GER.
- Avenue Pierre Sépard
- Route de Morière
- Rue Guy de Chaudiac
- Rue Raoul Follereau
- Dans le cadre de l'enveloppe GER nous mettrons en place des lampes de technologie LED en lieu et place des lampes à décharge sur 1000 luminaires reconstruits dans le cadre des investissements initiaux.
- Mise en place de 70 modules de télégestion dans les armoires de commande suite au paiement du bonus énergie.



VILLE EN TRANSITION


La ville en transition

En collaboration avec les services techniques, nous avons réalisé une note pour tendre vers une installation plus éco-responsable.

Liste de 7 solutions possibles à apporter à la ville :

- Suppression des luminaires situés dans les zones vertes vouées à l'agriculture ou sur les rocades extra urbaines.
- Extinction des mises en lumière à 1 heure du matin.
- Extinction des illuminations de fin d'année à 1 heure du matin.
- Mise en place de modules de télégestion dans les armoires de commandes.
- Faire évoluer les luminaires installés dans le cadre du PPP en installant des modules de télégestion aux points lumineux.
- Installation de luminaires intelligents sur les prochaines opérations de rénovations.
- Installation de luminaires intelligents avec détection de présence sur les voies mode doux.

En mettant en action un peu de chacune de ces solutions, l'empreinte écologique de la ville sera améliorée.



INEO RESEAUX SUD
Agence Sillon Rhodanien –
215 Rue des 4 gendarmes d'Ouvéa
84 000 Avignon - FRANCE
Tél. : 33 (0)4 32 70 70 30
Fax : 33 (0)4 90 82 47 85
